

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-223	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	001
	FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS		FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CODIGO	A-07	PROYECTO	Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla - Contrato de Concesión APP No. 003 de 2015	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/12/2023
---------------	-------------	-----------------	---	----------------------------	-------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL


CONCESIONARIO		INTERVENTORIA		ANI	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE S.A.S.		CONSORCIO INTERAEROPUERTOS		VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Representante Legal	Juan Francisco Herrera Bojanini	Representante Legal	David Ardila Briceño	Gerente	Carlos Alberto Carrasco Ramirez
Nº contrato	003 - 2015	Nº contrato	196 - 2015	Apoyo al seguimiento	José Ariel Muñoz Vargas Daniel Correa Calderon Edgar Fernando Acero Sergio Ivan Basallo Parra José Alain Hoyos Hernandez Arley Molano Sierra Luis Felipe Lugo Arias Poema Jineth Cardona Lancheros Javier Insuasti Baez Carolina Orbeagozo Sánchez
Composición Accionaria		Composición Accionaria			


Aeropuerto:	Internacional Ernesto Cortissoz
--------------------	--

Objeto del Contrato:	Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación Comercial, Adecuación, Modernización y Reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del Aeropuerto "Ernesto Cortissoz" de Barranquilla
-----------------------------	--

FECHAS IMPORTANTES

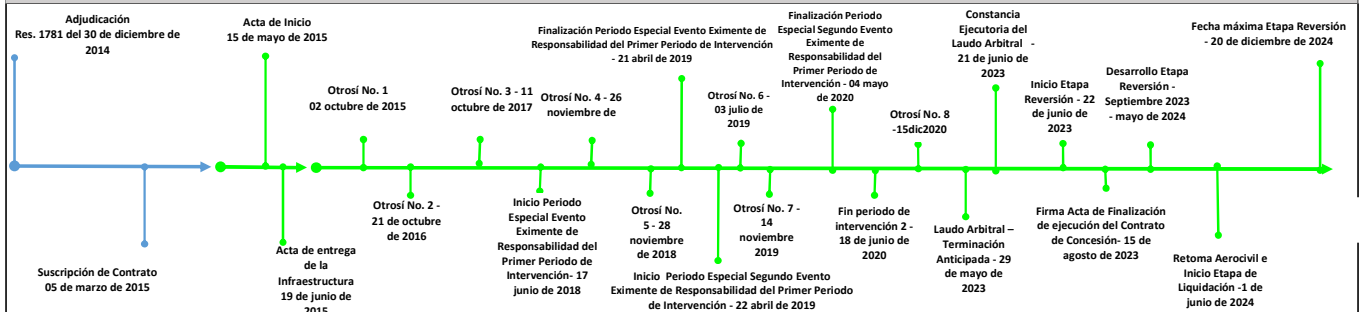

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO


 <p>Plan de intervenciones: Todas las actuaciones se desarrollarán en ocho (8) Períodos de Intervención o grupo de actuaciones</p>	% AVANCE GENERAL PRIMER Y SEGUNDO PERÍODO DE INTERVENCIÓN	100,00%	<p style="text-align: center;"><i>Adecuación, Modernización, Operación y Mantenimiento</i></p>
	% AVANCE ETAPA 1 - TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	100,00%	
	% AVANCE ETAPA 2 - TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	81,25%	
	% AVANCE ETAPA 3 - TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	53,63%	
	% AVANCE ETAPA 4 - TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	43,39%	
	% AVANCE GENERAL TERCER PERÍODO DE INTERVENCIÓN	72,27%	
	PERÍODOS CUATRO A OCHO	NO SE EJECUTARÁ	

SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y LADO AIRE

INTERVENCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO ESTIMADO	% EJECUTADO ESTIMADO	INVERSIÓN ESTIMADA EJECUTADA (M\$)
Pista 05-23: -Nivelación RESA. -Franjas de Pista. -Repavimentado de Pista. -Adecuación Márgenes de Pista. -Luces de Pista.	27/08/2016	18/06/2018	100,0%	100,0%	
Calles de Rodaje Existentes: -Repavimentado de Calles de Rodaje. -Adecuación Márgenes de Calle de Rodaje. -Construcción de Sobrecanchos de Rodadura. -Luces de Calle de Rodaje. -Adecuación Calles A1 y A2.	1/07/2016	17/03/2021	100,0%	100,0%	

Plataformas: -Reconstrucción de canales en plataforma comercial. -Renovación señalización plataforma. - Actualización letreros obligatorios - informativos). -Adecuación Plataforma de carga Lado Aire.	24/07/2017	18/06/2023	92,2%	89,9%	\$306.897,00
Vías vehiculares Internas: -Vías Perimetral. -Construcción de Vallado Doble. -Instalación de alumbrado en vallado perimetral. -Sistema de detección perimetral. -Zona Abastecimiento Combustible.	1/04/2017	18/06/2023	92,6%	56,9%	
Edificio: -Adecuación a normativa instalaciones Edificio Termina. -Remodelación e integración arquitectónica fachada - Ala Nacional. -Refuerzo Aire Acondicionado. -CECOA, METEO, Centro de control, Centro de Emergencias. -Sanidad. -Rayos X. -Bandas de equipaje. -Check In. -Mobiliario. -Edificio Administrativo. -Rampa 2. -Edificio Maletas Nacionales. -Ampliaciones Edificio Terminal Vestibulo Salidas - Áreas L. L. R. Nacional.	19/06/2015	18/06/2023	94,2%	81,5%	
Construcción o mejoramiento de infraestructura vial y parqueaderos: -Construcción vías externas. -Adecuación nuevos parqueaderos. -Mantenimiento Vial Taxi.	2/05/2018	18/06/2023	91,0%	72,7%	\$53.007,00
Ambiental. Construcción o mantenimientos de estructuras. -Ejecución sistemas ahorradores de agua. -PTAP -Adecuación instalación de residuos peligrosos. -Mejoras insonorización interior edificio. -Desmantelamiento cementerio de aeronaves. -Retirada y trasplante de árboles frutales. -Actualización señalización ambiental.	19/06/2015	18/06/2023	94,2%	46,0%	
Área de apoyo construcción o mejoramiento de Infraestructura: -Reforma subestación eléctrica. - Subestación Eléctrica Ayudas Visuales.	1/03/2018	28/02/2022	100,0%	78,0%	
Adquisición de áreas: -Adquisición de áreas Fase I (ampliación zona crítica Cabecera 23 y 05). -Adquisición de áreas Fase I (Urbanismo y accesos Av. General y MRO)	19/06/2015	28/02/2022	100,0%	99,6%	
Estudios y diseños: -Estudios, diseños y gestión ambiental durante las obras	19/06/2015	18/06/2023	94,2%	93,8%	
TOTAL					\$359.904,00

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA 2023



[Signature]
 CARLOS ALBERTO CÁRRASCO RAMÍREZ-GERENTE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

[Signature]
 JOSÉ ARIEL MUÑOZ VARGAS - LIDER EQUIPO DE SEGUIMIENTO

Fecha de elaboración: 12/03/2024
