



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO

GCSP-F-223

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN

001

FORMATO

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

FECHA

9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CODIGO

A-02

PROYECTO

AEROPUERTOS CENTRO NORTE

FECHA ACTUALIZACIÓN

12/03/2024



1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO



SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE S.A. – OACN S.A. – AIRPLAN S.A.

Gerente: SARA INES RAMIREZ RESTREPO  
Nº contrato: 8000011-OK DE 2008




INTERVENTORIA



CONSORCIO INTERVENTORÍA AEROPUERTOS 2014

Gerente: JOHN SEBASTIAN HENAO GÓMEZ  
Nº contrato: 049 DE 2014



ANI

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Supervisor del Contrato: CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA  
Gerente: Carlos Alberto Carrasco Ramírez  
Apoyo a la Supervisión: Beatriz Juliana Vanegas García (Lider), Angie Paola Gómez Triana (Técnico-Operativo), Jaime Arturo Mendoza Moreno (Jurídico), Liliana Andrea Villamizar Cabrera (Financiero), Diana Marcela Blanco (Ambiental), Johanna Andrea Reyes Ruíz (Social), José Alexander Vega (Riesgos), Luis Felipe Lugo Arias (Predial), Poema Jineth Cardona Lancheros (Jurídico Predial)

Aeropuertos

OLAYA HERRERA (MEDELLÍN)  
JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO)  
EL CARAÑO (QUIBDÓ)


Aeropuertos

LOS GARZONES (MONTERIA)  
ANTONIO ROLDAN BETANCOURT (CAREPA)  
LAS BRUJAS (COROZAL)

Objeto del Contrato:

(i) el otorgamiento por parte de la Aerocivil y a favor del Concesionario de la Concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt, del Aeropuerto El Caraño, del Aeropuerto José María Córdova, del Aeropuerto Las Brujas y del Aeropuerto Los Garzones, y (ii) el otorgamiento por parte del AOH y a favor del Concesionario de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Olaya Herrera, cambio de la remuneración de que trata el Capítulo III ( en lo sucesivo la “Concesión”). La Concesión se Otorga de conformidad con lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la ley 80 de 1993 y la ley 105 de 1993. La administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de los Aeropuertos entregados encargados a título de Concesión se hará por cuenta y riesgo exclusivo del Concesionario y en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. La supervisión y control de la ejecución de la Concesión está a cargo de los Concedentes, quienes la pueden ejercer directamente o a través de uno o varios Interventores

FECHAS IMPORTANTES

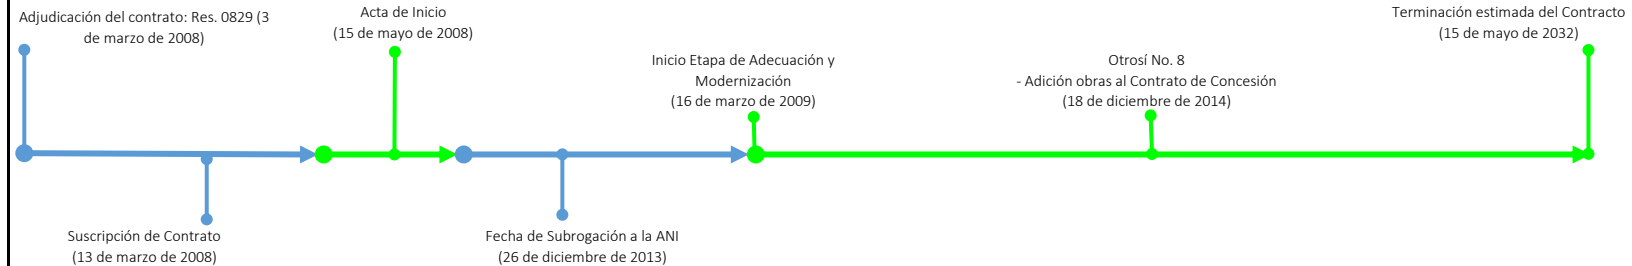



## 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

# 32,94%

ESTADO ACTUAL ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL

### SEGUIMIENTO A OBRAS LADO TIERRA Y PLATAFORMAS


OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)	
A. JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (RIONEGRO)	A.1. Ampliación muelle nacional	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,000
	A.2. Ampliación muelle internacional	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,400
	A.3. Ampliación de Plataforma	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 27,700
	A.4. Modulos de Conexión	1/06/2015	1/12/2017	100,00%	100,00%	\$ 13,196
	A.5. Punto Fijo B	1/06/2015	27/09/2019	100,00%	100,00%	\$ 3,804
	A.6. Terminal de Carga	15/03/2016	15/06/2020	100,00%	100,00%	\$ 55,000
B. LOS GARZONES (MONTERIA)	B.1. Ampliación Edificio Terminal de Pasajeros	4/05/2015	30/06/2017	100,00%	100,00%	\$ 28,574
C. EL CARAÑO (QUIBDÓ)	C.1. Ampliación de Pista y Plataforma	15/05/2015	30/08/2017	100,00%	100,00%	\$ 80,766
	C.2. Ampliación Terminal de Pasajeros	1/06/2015	28/02/2017	100,00%	100,00%	\$ 10,621
	C.3. Centro de Servicios	1/06/2015	2/04/2017	100,00%	100,00%	\$ 71,900
D. LAS BRUJAS (COROZAL)	D.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	13/12/2015	100,00%	100,00%	\$ 5,617
	D.2. Ampliación pista de aterrizaje	16/02/2015	13/12/2015	100,00%	100,00%	\$ 18,743
E. OLAYA HERRERA (MEDELLÍN)	E.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	15/08/2015	100,00%	100,00%	\$ 8,118
F. ANTONIO ROLDAN DE BETANCUR (CAREPA)	F.1. Repavimentación pista de aterrizaje	16/02/2015	16/02/2016	100,00%	100,00%	\$ 13,290


### INAGURACIONES DE LA VIGENCIA

2024



VERIFICADO

  
 CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ  
 GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS - VGCON

  
 BEATRIZ JULIANA VÁNEGAS GARCÍA  
 LIDER DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN EN LA ANI
