



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	GCSP-F-223
VERSIÓN	001
FECHA	9/12/2016

### INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	AC-01	PROYECTO	Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Sarmiento Angulo Contrato No. 6000169OK de 2006	FECHA ACTUALIZACIÓN	2/02/2024
--------	-------	----------	--	---------------------	-----------




## 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>EL DORADO</b>  <b>OPAIN S.A. - Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional</b> <b>Gerente</b> Natalí Leal Gomez <b>N.º contrato</b> 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006 <b>Composición Accionara</b> 		<b>INTERVENTORÍA OPERATIVA</b>  <b>CONSORCIO OPERADOR AEROPORTUARIO</b> <b>Directora</b> Silvia Fernández de Castro <b>N.º contrato</b> 9000070 OK del 4 de junio de 2009 <b>Composición Accionara</b> 		<b>ANI</b> <b>VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>GERENTE</b> CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ <b>Equipo Profesional:</b> Edgardo Garciaherreros Barrera (Coordinador), Aura M Rodriguez (Técnico), Gabriel Fernandez (Ambiental), Luis Enrique Moreno Barbosa (Financiero), Juan Manuel Cajiao Astroquiza (Jurídico), Paula Bedoya (Riesgos), Johanna Andrea Reyes Ruiz (Social)	
<b>INTERVENTORIA FINANCIERA</b>  <b>JAHV MCGREGOR</b> <b>Gerente</b> Crisanto Gonzalez Rivera <b>N.º contrato</b> Contrato 7000357 OH de 2007 <b>Composición Accionara</b> 		<b>INTERVENTORIA PROYECTO</b>  <b>INTERSA S.A.</b> <b>Directora</b> Isabel Leon Reyes <b>N.º contrato</b> Contrato VGCON 425-2023 <b>Composición Accionara</b> 			

Aeropuertos	Internacional Eldorado "Luis Carlos Galán Sarmiento" BOGOTÁ D.C.
-------------	--

Objeto del Contrato:	Contrato de Concesión para la Administración, Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento del Área Concesionada del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.
----------------------	--

### FECHAS IMPORTANTES

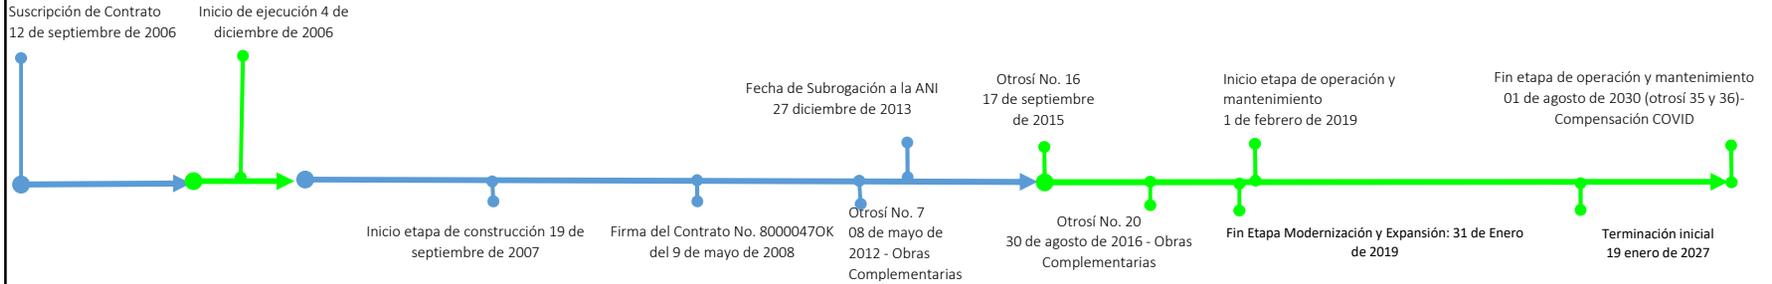

### 2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO

**72%**

ESTADO ACTUAL      Etapa Final (Operación y Mantenimiento)


% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por el Covid-19 del otrosí 36)

#### SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)
No aplica - Etapa Final					
Plataforma Hangar AV y zonas colindantes	26/12/2023	25/11/2025	2,19%	13,00%	\$ 18,56

#### INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2020



#### VERIFICADO

CARLOS ALBERTO CARRASCO RAMIREZ - GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS

EDGARDO GARCIA HERRERROS BARERA - Experto 8 Grado 3
