

Bogotá D.C



**PARA:** Dr. LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO  
Presidente

**DE:** DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de seguimiento los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a metas de gobierno – SINERGIA (PEI 52).

Estimado dr Andrade:

Comedidamente me permito remitir para su consideración el seguimiento a los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a metas de gobierno – SINERGIA (PEI 52) realizado en el mes de febrero de 2016, dando cumplimiento al Plan de Evaluación de Independiente que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

A continuación se anexa un cuadro, concluyendo lo evidenciado en la evaluación realizada:

Proyecto/Objeto de la auditoría	No Conformidades	Recomendaciones	Observaciones
Seguimiento a los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a metas de gobierno SINERGIA	3	5	0


Para contestar cite:  
Radicado ANI No.: \*RAD\_S\*  
\*\*RAD\_S\*\*  
Fecha: \*F\_RAD\_S\*

\*Estas no conformidades, recomendaciones y observaciones se denotan en el capítulo VI del informe que se anexa a la presente comunicación.

Con un muy cordial saludo,

  
**DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO**  
Jefe Oficina de Control Interno

C.C.:  
María Clara Garrido - Vicepresidenta Administrativa y Financiera  
Camilo Andres Jaramillo - Berrocal- Vicepresidente de Estructuración  
German Córdoba Ordoñez - Vicepresidente Ejecutivo  
Jaime García Mendez - Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno  
Alfredo Bocanegra Varón - Vicepresidente Jurídico  
Andres Figueredo Serpa - Vicepresidente de Gestión Contractual

Anexo: Informe (35 folios)  
Proyectó: María Natalia Norato - Contratista Oficina Control Interno   
Nro Borrador: 7060200482






Agencia Nacional de  
Infraestructura



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

# INFORME DE AUDITORÍA

Ministerio de Transporte

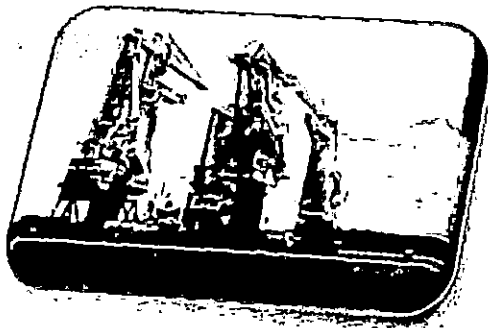

Informe de seguimiento a los planes de acción de las dependencias y el seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a metas de gobierno  
– SINERGIA (PEI 52)

# 2016



## TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE .....	3
3. METODOLOGÍA .....	3
4. MARCO NORMATIVO .....	4
5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES.....	5
5.1 Plan de Mejoramiento Institucional.....	5
5.2 Plan de Mejoramiento por Procesos.....	5
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	8
6.1 NO CONFORMIDADES.....	9
6.2 RECOMENDACIONES.....	9
7. ANEXOS.....	11

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Relación de no conformidades y su avance del PMP.....	8
Tabla 2 Reporte de avance de las metas SINERGIA a cargo de la agencia. ....	9
Tabla 3 Lista de chequeo al plan de acción y metas SINERGIA.....	12
Tabla 4 Plan De Acción 2015 Metas Cumplidas .....	49
Tabla 5 Plan De Acción 2015 Metas No Cumplidas.....	62
Tabla 6 Plan De Acción 2015 Metas sobresalientes.....	69

## 1. OBJETIVOS

---

Realizar seguimiento y evaluación a los planes de acción de las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y al cumplimiento de las metas SISMEG asignadas por el Departamento Nacional de Planeación-DNP.

## 2. ALCANCE

---

Realizar verificación a los planes de acción de las dependencias de la Agencia Nacional de Infraestructura y a las metas SISMEG, con corte al 31 de diciembre de 2015.

## 3. METODOLOGÍA

---

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno, es la usualmente implementada para la elaboración de este tipo de informes de acuerdo a los procedimientos, formatos y alcances dispuestos para tal fin. En este sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta dentro del sistema integrado de gestión con el procedimiento de Auditoría (Procedimiento EVCI-P-002) dentro del programa de Evaluación y Control Institucional.

Para el presente informe se consideraron los siguientes criterios:

**Solicitud de Información:** Se solicitó información a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) a través de correos electrónicos, de 14 y 20 de enero y 3 de febrero de 2016 referente al seguimiento del plan de acción y avance de las metas de gobierno; adicional a esto, se procedió a requerir evidencias documentales durante la reunión de auditoría con los servidores públicos Ricardo Aguilera Wilches y Nancy Marcela Rojas adscritos a la VPRE a medida que se abordaba cada tema.

**Revisión documental:** Se verificó el contenido de la información suministrada por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE), aportada a través de los correos electrónicos del 29 de enero, 11 de febrero y 22 febrero de 2016.

**Diligenciamiento de papeles de trabajo:** Se elaboró una lista de chequeo, que contemplara todos los temas relevantes para medir el porcentaje de cumplimiento del plan de acción 2015 por cada dependencia y metas SINERGIA.

**Entrevista y visita de campo:** Se llevó a cabo reunión con los servidores públicos Ricardo Aguilera Wilches y Nancy Marcela Rojas adscritos a la VPRE; se revisó el avance a la fecha del plan de mejora de las no conformidades generadas en las auditorías anteriores y el seguimiento del plan de acción y metas SINERGIA vigencia 2015

**Verificación documental:** Se procedió a validar la información suministrada con anterioridad, contra la información publicada en la página WEB de Entidad y la página [sinergia.dnp.gov.co](http://sinergia.dnp.gov.co).

**Valoración de la información:** se realizó la evaluación de la información remitida y se clasificó en tres grandes categorías: metas sobresalientes, metas cumplidas y metas no cumplidas, a partir de la diferencia entre la meta y el avance acumulado. Se identificó con color rojo cuando quiera que no hay cumplimiento, verde cuando es sobresaliente el nivel de avance y amarillo cuando el avance cumple con la meta prevista. Finalmente, la auditoría estableció mediante una tabla que incorpora una lista de chequeo, el balance frente al cumplimiento en la materia abordada.

**Análisis y conclusiones:** Como resultado de los anteriores puntos se generaron no conformidades y recomendaciones, que se ampliarán en el capítulo 6 del presente informe.

#### 4. MARCO NORMATIVO

---

- ✓ Decreto 1290 de 2014, “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – Sinergia”
- ✓ Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”.
- ✓ Ley 1474 de 2011, Artículo 74 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
- ✓ Directiva Presidencial No.21 del 01 de Septiembre 2011, “Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno-SISMEG”.
- ✓ Directiva Presidencial No.09 del 23 de Noviembre de 2010, “Directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados”.
- ✓ Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de la atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ Ley 152 de 1994, “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.
- ✓ Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”

## 5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

### 5.1 Plan de Mejoramiento Institucional

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, se evidencia la existencia de 16 hallazgos relacionados con el cumplimiento del plan de acción y metas SISMEG, generados por la Contraloría General de la República y que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría.

En la revisión de los diferentes hallazgos, se verifica que frente a los mismos se ha dado cumplimiento en las unidades de medida propuestas por el responsable para atender su causalidad, en virtud de dar efectivo cumplimiento y proceder al cierre respecto a lo solicitado por la Contraloría General de la República.

De esta manera, queda pendiente la revisión de estos, para que por parte de la comisión auditora de la Contraloría, se proceda a la verificación y cierre de los 16 hallazgos asociados al tema bajo examen.

### 5.2 Plan de Mejoramiento por Procesos

Al realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, formato EVCI-F-004, se evidencia la existencia de no conformidades en relación con el seguimiento a los planes de acción y seguimiento metas SISMEG, identificadas con los números: 1486, 2488, 2491, 2494, 2496, 2871, 2872, y 3002; es importante resaltar que, a través de correo de 25 de febrero del año en curso, el GIT de planeación envió el plan de mejoramiento y sus soportes para el avance y el cierre de las no conformidades, de tal forma que se revisaron y se incluyeron dentro del avance que se presenta a continuación:

RELACION DE NO CONFORMIDADES Y SU AVANCE DEL PMP			
No.	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES/CI	AVANCE
1486	<p>4. Garantizar la veracidad de la información reportada en la página Web, <a href="http://sinergia.dnp.gov.co">sinergia.dnp.gov.co</a> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El primer indicador (Nuevos kilómetros de doble calzada en operación) en la Página Web, <a href="http://sinergia.dnp.gov.co">sinergia.dnp.gov.co</a>, reporta como meta para el año 2013, una cifra de 204,81Kms con corte al 31/03/2013 y en el informe remitido por la VPRE reporta una cifra de 189,30 Kms.</li> <li>El segundo indicador (Nuevos kilómetros de doble calzada construidos) en la Página Web, <a href="http://sinergia.dnp.gov.co">sinergia.dnp.gov.co</a>, reporta como meta para el año 2013, una cifra de 267,02 Kms con</li> </ul>	<p>Se verificaron los soportes de los controles implementados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento en la herramienta Project On line y Sharepoint.</li> <li>* Formato en Excel donde reportan el avance detallado que remiten por correo electrónico al Ministerio de Transporte.</li> </ul> <p>Estas acciones previenen que se genere una desarticulación con la información reportada por la Agencia.</p>	100%

RELACION DE NO CONFORMIDADES Y SU AVANCE DEL PMP			
Nº	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES OCI	AVANCE
	<p>corte al 31/03/2013 y en el informe remitido por la VPRE reporta una cifra de 300,00. Kms</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El quinto indicador (Nuevos kilómetros de red férrea en operación) en la Página Web, <a href="http://sinergia.dnp.gov.co">sinergia.dnp.gov.co</a>, reporta como meta para el año 2013, una cifra de 361,00 Kms con corte al 31/12/2012 y en el informe remitido por la VPRE reporta una cifra de 00,00 Kms.</li> <li>• El séptimo indicador (Toneladas de carga transportada en red férrea) en la Página Web, <a href="http://sinergia.dnp.gov.co">sinergia.dnp.gov.co</a>, reporta como meta para el año 2013, una cifra de 53,20 Kms con corte al 30/04/2013 y en el informe remitido por la VPRE reporta una cifra de 45,00 Kms.</li> <li>• En la Página Web, <a href="http://sinergia.dnp.gov.co">sinergia.dnp.gov.co</a>, se reportan dos indicadores (Variación PIB de servicios de transporte y Variación PIB obras civiles) los cuales no son reportados por el informe remitido por la VPRE.</li> </ul>		
2488	<p>2. Los siguientes indicadores no alcanzaron las metas planteadas al 30 de junio de 2014 en el SISMEG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Nuevos kilómetros de doble calzada construidos: reportó un avance del 22.00%</li> <li>* Toneladas de carga transportada en red férrea: reportó un avance del 41.00% (ver tabla No. 9)</li> </ul>	<p>La VPRE aportó los soportes consistentes en informes ejecutivos que generan las alertas de las metas mensuales (ANI CÓMO VAMOS) que presentan en el comité de presidencia. Estos informes generan las alertas que previenen a las vicepresidencias para que se logre cumplir con sus metas establecidas en el plan de acción.</p>	100%
2491	<p>5. No existe una herramienta que articule el Plan de acción, con el Plan Estratégico Institucional, las metas SISMEG y los indicadores de gestión por procesos, (No hay un enlace visible entre el resultado de las metas de gobierno y los planes de acción planteados por cada una de las dependencias, al igual que el avance de las metas para el período evaluado).</p>	<p>Se ha mejorado en la articulación entre el plan estratégico y el plan de acción falta alinearlos con las metas SINERGIA, para subsanar por completo la no conformidad. La VPRE presentó el plan de mejoramiento.</p>	80%
2494	<p>8. El indicador del SISMEG "Porcentaje de avance de obra en concesión" no tiene meta establecida para la vigencia 2014. (Ver tabla No. 10).</p>	<p>La VPRE explicó que este indicador se eliminó por no estar incluido en el PND2015-2018. Se verificó en la página SINERGIA</p>	100%



RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES Y SU AVANCE DEL PMP			
No	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES OGI	AVANCE
2496	<p>10. La información reportada en la página Web "sinergia.dnp.gov.co.", no coincide con la información reportada por la VPRE en los siguientes casos: (Ver tabla No. 10).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La meta para 2014 "Nuevos kilómetros de doble calzada en operación", aparece en la página web, sinergia.dnp.gov.co, como 363,26 Km, mientras que el informe remitido por la VPRE reporta 150,13 Km.</li> <li>• La meta para 2014 "Nuevos kilómetros de doble calzada construidos", aparece en la página web, sinergia.dnp.gov.co, como 389,36 Km, mientras que el valor reportado por la VPRE es de 300,27 Km, como meta SISMEG y el valor reportado en el plan de acción es de 299,26 Km. (Ver tabla No.8).</li> <li>• La meta para 2014 "Nuevos kilómetros de red férrea en operación", aparece en la página web, sinergia.dnp.gov.co, como 337,00 Km, mientras que el valor reportado por la VPRE es de 835,00 Km.</li> <li>• La meta para 2014 "Toneladas de carga transportada en red férrea", aparece en la página web, sinergia.dnp.gov.co, como 56,90 Tn, mientras que el valor reportado por la VPRE es de 44,39 Tn, como meta SISMEG y el valor reportado en el plan de acción es de 44,39 Tn. (Ver tabla No.9).</li> </ul>	<p>Se verificaron los soportes de los controles implementados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento en la herramienta Project On line y Sharepoint.</li> <li>* Formato en Excel donde reportan el avance detallado que remiten por correo electrónico al Ministerio de Transporte.</li> </ul> <p>Estas acciones previenen que se genere una desarticulación con la información reportada por la Agencia.</p>	100%
2872	<p>2. No hay un enlace visible entre el resultado de las metas de gobierno y los planes de acción planteados por cada una de las dependencias, al igual que el avance de las metas para el periodo evaluado. Adicionalmente el valor de la meta en el plan de acción es diferente a la meta del reporte para la vigencia 2015.</p>	<p>La VPRE presentó el plan de mejoramiento. <i>Con el fin de identificar las metas en el formato de seguimiento de plan de acción se incluirá una columna donde se identifique la actividad que aporta a los diferentes Planes.</i> Pendiente la ejecución</p>	50%
2873	<p>3. Los indicadores del SISMEG descritos a continuación, no tienen metas establecida para la vigencia 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Inversión privada en infraestructura de carretera (billones de \$ acumulados en el cuatrienio) - ANI</li> <li>*Inversión privada en infraestructura férrea, aeroportuaria y portuaria (billones de \$ acumulados en el cuatrienio) – ANI</li> </ul>	<p>Se verificó el soporte y se contrastó con el reporte de SINERGIA</p>	100%

RELACION DE NO CONFORMIDADES Y SU AVANCE DEL PMP			
No.	DESCRIPCION NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES OGI	AVANCE
	*Red Férrea en operación (Km) - ANI ( km a punto para ser operados)*		
3002	1. De los planes de acción de cada una de las dependencias de la entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, se advierte que el 41.0% de las acciones programadas en dichos planes no se cumplió acorde con las metas establecidas para el período enero-septiembre de 2015. (Ver tabla 5).	La VPRE presentó el plan de mejoramiento. <i>Se está iniciando la implementación del Sistema Integrado de Calidad, donde se cargarán las metas de los planes de acción anual y se realizará reporte de avance de estas.</i> Pendiente la ejecución	50%

Tabla 1 Relación de no conformidades y su avance del PMP.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de analizar el seguimiento al plan de acción, se evidenció que el 68.81% de las actividades programadas en el plan de acción vigencia 2015 cumplieron con la meta prevista y el 10.71% de las actividades superaron las metas de las actividades programadas en el plan de acción vigencia 2015.

Se resalta que en el 2015 la entidad implementó un sistema de información de calidad, donde se generaron las fichas de los indicadores del plan de acción y se generan los reportes de avance.

Por otro lado, el GIT de planeación reportó en SINERGIA los avances de los siete indicadores a cargo de la Agencia como se muestran en la siguiente tabla:

N°	INDICADOR SISMEG	Año	Meta	Avance	% Avance	fecha de corte
1	Inversión privada en infraestructura de carretera (billones de \$ acumulados en el cuatrienio) - ANI	2015	3,50	3,45	98,57%	31/12/2015
2	Inversión privada en infraestructura férrea, aeroportuaria y portuaria (billones de \$ acumulados en el cuatrienio) - ANI	2015	1,05	1,40	133,33%	31/12/2015
3	Kilómetros de Vías intervenidas bajo esquema de APP	2015	8.083,00	9.924,00	223,72%	31/12/2015
4	Kilómetros de calzadas construidas a través de concesión	2015	2.126,00	2.052,80	77,79%	31/12/2015
5	Kilómetros de red férrea en operación - ANI	2015	1.026,00	1.649,00	256,53%	31/12/2015
6	Número de Proyectos Adjudicados	2015	26	27	106,25%	31/12/2015
7	Número de proyectos en ejecución Programa 4G	2015	20	24	128,57%	31/12/2015

Tabla 2 Reporte de avance de las metas SINERGIA a cargo de la agencia.

Cada indicador reporta las observaciones pertinentes del cumplimiento o no cumplimiento de la meta de la vigencia evaluada.

### 6.1 NO CONFORMIDADES

Se presentan las siguientes no conformidades en virtud de la auditoría realizada, las cuales deben atenderse para subsanar los incumplimientos tales como las que se presentan a continuación:

1. De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe consolidado de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, el 20.48% de las acciones programadas en dichos planes no se cumplieron acorde con las metas establecidas para la vigencia 2015. (Ver tabla 5).

Cada dependencia, en función de sus acciones incumplidas deberá abordar una estrategia y un plan que permita superar o justificar dicho incumplimiento.

2. Se publicaron en la página web de la entidad los indicadores por proceso, generados del plan de acción; sin embargo, falta que los indicadores sean validados por los líderes de proceso y realicen el análisis de estos.

3. Los soportes del seguimiento del 4to trimestre del plan de acción vigencia 2015, no corresponden a los determinados en la metodología plan de acción SEPG-I-006.

- Se evidenció que el reporte de la VGC se realizó a través de presentaciones, lo cual origina un incumplimiento de la metodología plan de acción SEPG-I-006 y el formato seguimiento plan de acción SEPG-F-011 haciendo que se presenten errores en el consolidado del seguimiento del plan de acción.
- Algunos de los seguimientos presentados por las diferentes dependencias no incluyen las observaciones pertinentes del no cumplimiento ni las evidencias que se deben relacionar.

### 6.2 RECOMENDACIONES

1. Mantener actualizado el sistema de información de calidad con el seguimiento del plan de acción. Con el fin de mantener al día los indicadores. generar los reportes a las diferentes áreas, con su correspondiente análisis.
2. Publicar en la página web un informe del análisis de medición de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del plan de acción.

3. Ajustar el numeral 5.6 de la metodología para el seguimiento de actividades SEPG-I-006, el cual hace referencia al numeral 3.7 que no existe.
4. Garantizar que las dos metas “Meta año y Meta” reportadas en la información de la VPRE coincidan. Seguimiento plan de acción
5. Garantizar que la información reportada en la página de SINERGIA se visualice completa, caso específico para el indicador “Número de proyectos en ejecución Programa 4G”, en la descripción del comportamiento anual del indicador no registra la línea base, lo que genera confusión con el resumen anual – histórico del año 2015, porque el avance no coincide.


← → [sinergiapp.dnp.gov.co/indicador/ProgFntf/26/1254/5177/18](http://sinergiapp.dnp.gov.co/indicador/ProgFntf/26/1254/5177/18)

### Resumen Anual - Histórico

En el año 2015 se firmaron las actas de inicio de 18 proyectos, de los cuales 11 proyectos son APP Público y 7 por Iniciativas privadas, superando la meta estimada para este año.

Fecha de corte: 31/12/2015  
 Fecha de actualización: 03/02/2016

#### Avances del indicador por Periodos

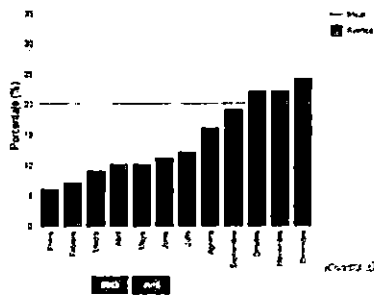

Periodo	Porcentaje (%)
Ene	10
Feb	11
Mar	12
Abr	13
May	14
Jun	15
Jul	16
Ago	18
Sep	20
Oct	22
Nov	23
Dic	24

#### Comportamiento anual del Indicador

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	-	-
Ene-Dic 2015	20.00	24.00	120.57%
Ene-Dic 2016	36.00	-	-
Ene-Dic 2017	-	-	-
Ene-Dic 2018	-	-	-
2014-2018	36.00	24.00	66.67%

Atentamente,



**DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO**  
 Jefe de Oficina de Control Interno  
 Proyecto: Maria Natalia Norato Mora – Contratista Oficina de Control Interno.

## 7. ANEXOS

LISTA DE CHEQUEO AL PLAN DE ACCIÓN Y METAS SINERGIA					
CRITERIO	EVIDENCIA	CONFORME	NO CONFORME	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
Se cumple con las metas establecidas en los planes de acción, (Metas cumplidas y superadas)	La VPRE remitió el seguimiento 4do trimestre consolidado a través de correo de 11 febrero de 2016 Se verificó la información en la página web de la Entidad. (12/02/2016)	X		De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, el 68.81% de las actividades cumplieron y el 10.71% de las actividades superaron las metas de las actividades programadas en el plan de acción vigencia 2015	N.A.
Se cuenta con fichas de indicadores para medir el avance en la planeación. (MECI 2014)	Se verificó la información en el aplicativo de calidad de la Entidad en el link: <a href="http://54.165.63.184/ANI/lib/indicadores/ficha_indicador1.php?id=16&amp;id_indicador=117&amp;id_objetivo=16">http://54.165.63.184/ANI/lib/indicadores/ficha_indicador1.php?id=16&amp;id_indicador=117&amp;id_objetivo=16</a>	X		La entidad cuenta con un sistema de información de calidad, donde se llevan las fichas de los indicadores del plan de acción y se generan reportes de avance.	Mantener actualizado el aplicativo con el seguimiento del plan de acción. Con el fin medir el estado de avance
Se analizan los indicadores de avance a la gestión.	Indicadores por proceso Link de la ANI de los indicadores de proceso <a href="http://www.ani.gov.co/planes-politicas/indicadores/indicadores-por-proceso">http://www.ani.gov.co/planes-politicas/indicadores/indicadores-por-proceso</a>		X	Se publicaron en la página web de la entidad los indicadores por proceso, generados del plan de acción, sin embargo falta validar los indicadores con los líderes de proceso y realizar análisis de estos.	Generar un informe que contenga el análisis y seguimiento de los indicadores.

LISTA DE CHEQUEO AL PLAN DE ACCIÓN Y METAS SINERGIA					
Las áreas o dependencias reportan los seguimientos y ajustes del plan de acción de acuerdo con la metodología establecida por la VPRE. SEPG-I-006	Reportes de avance del cuarto trimestre del plan de acción de las diferentes o dependencias.		X	Los soportes del seguimiento del 4to trimestre del plan de acción vigencia 2015, no corresponden a los determinados en la metodología plan de acción SEPG-I-006. Se evidenció que el reporte de la VGC se realizó a través de presentaciones, lo que genera que se presenten errores, en el consolidado del seguimiento del plan de acción. Adicionalmente no todas las áreas o dependencias incluyen las observaciones pertinentes del no cumplimiento ni las evidencias que se deben relacionar.	N.A.
Se cumple con las metas establecidas en los planes de acción, (Metas no cumplidas).	La VPRE remitió el seguimiento 4to trimestre consolidado a través de correo de 11 febrero de 2016		X	De los planes de acción de cada una de las dependencias de la Entidad y que fueron presentados por la VPRE en su informe de seguimiento a la ejecución de los mencionados planes, y publicado en la página web se evidenció que el 20.48% de las acciones programadas en dichos planes no se cumplió acorde con las metas establecidas para la vigencia 2015.	Revisar y analizar el no cumplimiento de las metas del plan de acción
El avance de los indicadores SINERGIA reportados por la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, están reportados en la Página Sinergia del DNP.	Se verificó en la Página Web, sinergia.dnp.gov.co (11/12/2014).		X	La información del avance de las metas SINERGIA para la vigencia 2015 a cargo de la Agencia esta publicada en la página de SINERGIA.	Garantizar que la información reportada en la página de SINERGIA se visualice completa; caso específico la línea base del indicador "Número de proyectos en ejecución Programa 4G, con el fin de que la información sea clara y veraz

*Tabla 3 Lista de chequeo al plan de acción y metas SINERGIA*

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
1	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Poner en marcha Sistema de Control de Trenes - ITCS	Glb	1	1		Cumple
2	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Formular el Plan de reasentamiento (Sector Bosconia)	Und	1	1		Cumple
3	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Formular el Plan de reasentamiento (Sector Fundación)	Und	1	1		Cumple
4	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Formular el Plan de reasentamiento (Sector Orihueca)	Und	1	1		Cumple
5	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Formular el Plan de reasentamiento (Sector Tucurinca, Guacamayal y Sevilla)	Und	1	1		Cumple
6	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Formular el Plan de reasentamiento (Sector Aracataca)	Und	1	1		Cumple
7	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada)	%	1	1		Cumple
9	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Construir segunda Línea sector Algarrobo	km	0,7	0,7		Cumple
14	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Contratar en Bogotá - Belencito la recuperación Puntos Críticos Total: 34 Puntos - Pendientes 2015	Und	17	17		Cumple
15	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Mantener 522 km en el proyecto Dorada - Chiriguaná	Km	207	207		Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
16	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Mantener 257 km en el proyecto Bogotá -Belencito	Km	185	185		Cumple
17	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar el mejoramiento a 50km en el proyecto Dorada - Chiriguaná	Km	50	50		Cumple
18	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar el mejoramiento a 30 km en el proyecto Bogotá - Belencito	Km	30	30		Cumple
19	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Realizar de visitas de Seguimiento a los proyectos	Und	36	36		Cumple
21	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del pacifico	Realizar Informe de Gestión Trimestral (Supervisores)	Informe	4	4		Cumple
25	Vicepresidencia de gestión contractual	Grupo Interno De Trabajo Portuario	Revisar el cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión)	Informe	56	56		Cumple
26	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	Construcción Aeropuerto de Santa Marta	Acta de Inicio	1	1		Cumple
27	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	Climatización Aeropuerto Cúcuta	Acta de Inicio	1	1		Cumple
28	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	Climatización Aeropuerto Valledupar	Acta de Inicio	1	1		Cumple
30	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	Pavimentación pista Aeropuerto - Montería	Acta de Inicio	1	1		Cumple
31	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	Pavimentación pista Aeropuerto - Jose Maria C	Actas de Recibo	1	1	EL 16 de diciembre se recibieron las obras correspondientes a la repavimentación de la Pista de aterrizaje y la construcción de la	Cumple



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
							terminal Interejecutiva	
32	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	Pavimentación pista Aeropuerto - Olaya H	Acta de Inicio	1	1		Cumple
33	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	construcción del nuevo SEI - Cali	Actas de Recibo	1	1		Cumple
34	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	remodelación del satélite nacional del edificio actual - Cali	Actas de Recibo	1	1		Cumple
35	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	CODAD-Calles de salidas rápidas y calle de interconexión	Acta de Inicio	1	1		Cumple
36	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	construcción del nuevo SEI - Cartagena	Acta de Inicio	1	1	Con corte al 16 de diciembre las obras de construcción han avanzado en el 23%	Cumple
37	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	construcción de Franjas - Cartagena	Acta de Inicio	1	1	Las obras iniciaron en el mes de abril y a 16 de diciembre tienen un avance del 77%	Cumple
38	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	OPAIN-Ampliación terminal nacional de pasajeros - sur	Acta de Inicio	1	1		Cumple
39	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	OPAIN-Ampliación terminal internacional de pasajeros norte	Acta de Inicio	1	1		Cumple
40	Vicepresidencia de gestión contractual	1_Malla Vial del Meta	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	185,04	185,04		Cumple
44	Vicepresidencia de gestión contractual	2_Siberia El Vino Villeta	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	82,40	82,4		Cumple
45	Vicepresidencia de gestión contractual	2_Siberia El Vino Villeta	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
46	Vicepresidencia de gestión contractual	3_Santa Marta Paraguachón	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	285	285		Cumple
47	Vicepresidencia de gestión contractual	3_Santa Marta Paraguachón	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
48	Vicepresidencia de gestión contractual	4_Bogotá Villavicencio	Construir Segunda Calzada	Km\ SC	3,4	3,4		Cumple
50	Vicepresidencia de gestión contractual	4_Bogotá Villavicencio	Construir Puentes sectores 2A y 3A	Puente Vehicular	4	4		Cumple
51	Vicepresidencia de gestión contractual	4_Bogotá Villavicencio	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
52	Vicepresidencia de gestión contractual	5_Cartagena Barranquilla	Anillo Vial de Crespo - Doble Calzada	Km-DC	5	5		Cumple
53	Vicepresidencia de gestión contractual	5_Cartagena Barranquilla	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	121,86	121,86		Cumple
54	Vicepresidencia de gestión contractual	5_Cartagena Barranquilla	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
55	Vicepresidencia de gestión contractual	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Construir intersección portachuelo	Glorieta	1	1		Cumple
56	Vicepresidencia de gestión contractual	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	50,58	50,58		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
57	Vicepresidencia de gestión contractual	6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
59	Vicepresidencia de gestión contractual	7_Fontibón Facatativá Los Alpes	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	38,38	38,38		Cumple
60	Vicepresidencia de gestión contractual	7_Fontibón Facatativá Los Alpes	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
61	Vicepresidencia de gestión contractual	8_Neiva Espinal Girardot	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	168,1	168,1		Cumple
62	Vicepresidencia de gestión contractual	8_Neiva Espinal Girardot	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
64	Vicepresidencia de gestión contractual	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	297	297		Cumple
65	Vicepresidencia de gestión contractual	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Realizar informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
66	Vicepresidencia de gestión contractual	10_Armenia Pereira Manizales	Realizar la construcción Glorieta calle 52 en Dosquebradas	Un	1	1	La glorieta está terminada y se encuentra en operación. Esta obra permite mejorar las condiciones de movilidad de esta vía en el paso por el Municipio de Dosquebradas	Cumple
69	Vicepresidencia de gestión contractual	10_Armenia Pereira Manizales	Realizar la Rehabilitación Calarcá-La Española	Km-año	10,5	10,5	Se continúan las actividades de fresado, colocación de carpeta asfáltica y construcción de obras de arte. Se finalizará en la vigencia 2016	Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia:	Concesión:	Actividad:	Unidad de Medida:	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
70	Vicepresidencia de gestión contractual	10_Armenia Pereira Manizales	Mantenimiento periódico	Km	20,5	20,5		Cumple
71	Vicepresidencia de gestión contractual	10_Armenia Pereira Manizales	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	188,7	188,7		Cumple
72	Vicepresidencia de gestión contractual	10_Armenia Pereira Manizales	Realizar informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
73	Vicepresidencia de gestión contractual	11_Pereira La Victoria	Construir Segunda Calzada	Km - SC	0,3	0,3		Cumple
74	Vicepresidencia de gestión contractual	11_Pereira La Victoria	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	54,40	54,40		Cumple
77	Vicepresidencia de gestión contractual	12_Área Metropolitana de Cúcuta	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	80,43	80,43		Cumple
78	Vicepresidencia de gestión contractual	12_Área Metropolitana de Cúcuta	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
80	Vicepresidencia de gestión contractual	13_Girardot Ibagué Cajamarca	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	140,83	140,83		Cumple
81	Vicepresidencia de gestión contractual	13_Girardot Ibagué Cajamarca	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
85	Vicepresidencia de gestión contractual	14_Ruta del Sol 2	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
88	Vicepresidencia de gestión contractual	15_Transversal de las Américas	Construcción puente vehicular	Un	1	1	Terminación del puente Talaigua Nuevo sobre el río magdalena (Long. 507 m).	Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
91	Vicepresidencia de gestión contractual	15_Transversal de las Américas	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
92	Vicepresidencia de gestión contractual	16_Mulalo - Loboguerrero	Plan adquisición predial	Plan	1	1		Cumple
93	Vicepresidencia de gestión contractual	16_Mulalo - Loboguerrero	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
95	Vicepresidencia de gestión contractual	17_Zipaquirá-Palenque-N	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
96	Vicepresidencia de gestión contractual	18_Conexión Pacífico 1	Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		Cumple
98	Vicepresidencia de gestión contractual	18_Conexión Pacífico 1	Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		Cumple
100	Vicepresidencia de gestión contractual	18_Conexión Pacífico 1	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
101	Vicepresidencia de gestión contractual	19_Conexión Pacífico 2	Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		Cumple
102	Vicepresidencia de gestión contractual	19_Conexión Pacífico 2	Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		Cumple
103	Vicepresidencia de gestión contractual	19_Conexión Pacífico 2	Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		Cumple
104	Vicepresidencia de gestión contractual	19_Conexión Pacífico 2	Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
105	Vicepresidencia de gestión contractual	19_Conexión Pacífico 2	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
106	Vicepresidencia de gestión contractual	20_Conexión Pacífico 3	Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		Cumple
107	Vicepresidencia de gestión contractual	20_Conexión Pacífico 3	Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		Cumple
108	Vicepresidencia de gestión contractual	20_Conexión Pacífico 3	Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		Cumple
109	Vicepresidencia de gestión contractual	20_Conexión Pacífico 3	Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		Cumple
110	Vicepresidencia de gestión contractual	20_Conexión Pacífico 3	Realizar mantenimiento y operación vía existente	Km-mes	118	118		Cumple
111	Vicepresidencia de gestión contractual	20_Conexión Pacífico 3	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
112	Vicepresidencia de gestión contractual	21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad	Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		Cumple
113	Vicepresidencia de gestión contractual	21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad	Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		Cumple
114	Vicepresidencia de gestión contractual	21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad	Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
115	Vicepresidencia de gestión contractual	21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad	Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		Cumple
117	Vicepresidencia de gestión contractual	22_Girardot_Puerto Salgar_Honda	Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		Cumple
118	Vicepresidencia de gestión contractual	22_Girardot_Puerto Salgar_Honda	Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		Cumple
119	Vicepresidencia de gestión contractual	22_Girardot_Puerto Salgar_Honda	Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		Cumple
120	Vicepresidencia de gestión contractual	22_Girardot_Puerto Salgar_Honda	Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		Cumple
121	Vicepresidencia de gestión contractual	22_Girardot_Puerto Salgar_Honda	Realizar mantenimiento y operación vía existente	Km-mes	140	140		Cumple
122	Vicepresidencia de gestión contractual	22_Girardot_Puerto Salgar_Honda	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
123	Vicepresidencia de gestión contractual	23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1		Cumple
124	Vicepresidencia de gestión contractual	23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	1		Cumple
125	Vicepresidencia de gestión contractual	23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Elaborar el Plan de obras	Plan	1	1		Cumple
126	Vicepresidencia de gestión contractual	23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
127	Vicepresidencia de gestión contractual	23_Perimetral del Oriente de Cundinamarca	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
128	Vicepresidencia de gestión contractual	24_Conexión Norte	Elaborar Plan adquisición predial	Plan	1	1	El Plan de encuentra en revisión por parte del a interventoría	Cumple
130	Vicepresidencia de gestión contractual	25_Rio Magdalena 2	Plan adquisición predial	Plan	1	1		Cumple
133	Vicepresidencia de gestión contractual	26_Loboguerrero-Buga	Mantenimiento Rutinario	Km	55,4	55,4		Cumple
134	Vicepresidencia de gestión contractual	26_Loboguerrero-Buga	Informe de seguimiento	Informe	12	12		Cumple
135	Vicepresidencia de gestión contractual	27_IP Cesar_Guajira	Construcción Calzada Sencilla Valledupar-Badillo	Km-CS	3,2	3,2	Meta no programada originalmente en el Plan de Acción	Cumple
137	Vicepresidencia Ejecutiva	27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Construir puente peatonal CIAT MVVCC	Puente Peatonal	1	1,00	Puente peatonal terminado en diciembre de 2015	Cumple
138	Vicepresidencia Ejecutiva	27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Obtener Licencias ambientales MVVCC	Licencia	1	1		Cumple
139	Vicepresidencia Ejecutiva	27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Suscribir Otrosí Modificatorio acordando los efectos financieros de la modificación del otrosí No. 9 y resolver el balance de obras que no tengan discrepancia MVVCC	Un	1	1		Cumple
141	Vicepresidencia Ejecutiva	27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	388,82	388,82		Cumple



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
142	Vicepresidencia Ejecutiva	27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Realizar Comité de seguimiento	Informe	36	36		Cumple
143	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Entrada Paipa, K146+200 al K147+180	Km\ SC	0,98	0,98		Cumple
145	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 14, Mortifal - Paipa, Predio La Laguna perteneciente al señor Cavalier, K137+120 al K138+000	Km\ SC	0,88	0,88		Cumple
146	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 15, Paipa - Duitama, Predio La Britalia perteneciente al señor Cavalier, K4+690 al K4+850	Km\ SC	0,57	0,57		Cumple
147	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio la samaria variante tocancipa, K1+100 al K1+625	Km\ SC	1,05	1,05		Cumple
148	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 3, Variante Tocancipa, Predio Ecopetrol variante tocancipa, K4+690 al K4+850	Km\ SC	0,32	0,32		Cumple
149	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Terminar Trayecto 3, Variante Tocancipá	Km\ DC	9,32	9,32		Cumple
150	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	322	322		Cumple
152	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente San Raimundo	Puente Peatonal	1	1	Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Agosto de 2015.	Cumple
153	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente Balcones del Bósque	Puente Peatonal	1	1	Construido y en servicio. Pendiente atención a observaciones, paraderos e iluminación.	Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
154	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente Templo Krishna	Puente Peatonal	1	1	Construido y en servicio. Pendiente atención a observaciones, paraderos e iluminación.	Cumple
156	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente Azafranal - Divino Niño	Puente Peatonal	1	1,0	Pendiente atención a observaciones e iluminación. Se realizó prueba de carga en el mes de Julio. Pendiente aprobación interventoría.	Cumple
176	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Realizar comité de seguimiento	Informe	24	24	Se adelantan seguimientos periódicos a la ejecución del contrato con el fin de lograr que el proceso de reversión se ejecute en los mejores términos.	Cumple
177	Vicepresidencia Ejecutiva	30_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Realizar Rehabilitación calzada existente Tramo 6	Km rehabilitados	2,12	2,12	Atraso de obra Bajos rendimientos Poca disponibilidad de maquinaria y equipo. Actividades de Rehabilitación y Construcción suspendidos desde Acuerdo Conciliatorio (17 nov)	Cumple
178	Vicepresidencia Ejecutiva	30_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Realizar Construcción Puente Peatonal Tramo 4	Puente Peatonal	1	1	Se finaliza en el mes de diciembre el mobiliario urbano de este puente	Cumple
179	Vicepresidencia Ejecutiva	30_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	68,4	68,4		Cumple
181	Vicepresidencia Ejecutiva	31_Rumichaca Pasto Chachagófi	Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo	Acuerdo	1	1	Se suscribió por las partes Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del Contrato de concesión No.003 de 2006, el 6 de febrero de 2015 y fue aprobado por el Tribunal de arbitramento mediante auto No.45 el 20 de marzo de 2015.	Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
183	Vicepresidencia Ejecutiva	31_Rumichaca Pasto Chachagúf	Recibir infraestructura del proyecto	Informe recibido	1	1	El 4 de mayo de 2015 la ANI recibió la infraestructura vial del Concesionario DEVINAR S.A. mediante Acta de reversión y entrega	Cumple
184	Vicepresidencia Ejecutiva	31_Rumichaca Pasto Chachagúf	Entregar de corredor vial al INVIAS	Acta entrega	1	1	El 4 de mayo de 2015 la ANI entregó la infraestructura vial al INVIAS mediante Acta de reversión y entrega	Cumple
185	Vicepresidencia Ejecutiva	31_Rumichaca Pasto Chachagúf	Realizar mantenimiento Rutinario	Km	138,9	139,0	Se reportar el mantenimiento rutinario de todo el corredor vial en los informes mensuales de Interventoría. Se suscribió por las partes Acuerdo conciliatorio para la terminación anticipada del Contrato de concesión No.003 de 2006, el 6 de febrero de 2015 y fue aprobado por el Tribunal de arbitramento mediante auto No.45 el 20 de marzo de 2015.El 4 de mayo de 2015 la ANI entregó la infraestructura vial al INVIAS mediante Acta de reversión y entrega.	Cumple
186	Vicepresidencia Ejecutiva	31_Rumichaca Pasto Chachagúf	Realizar Comité de seguimiento	Informe	8	8	A partir del mes de mayo que se hizo entrega de la infraestructura no se han generado informes de seguimiento	Cumple
187	Vicepresidencia Ejecutiva	32_Córdoba Sucre	Construir Segunda calzada La Yé - Sahagún	Km\ SC	15,0	15		Cumple
190	Vicepresidencia Ejecutiva	32_Córdoba Sucre	Construir Segunda calzada paralela a la circunvalar de Montería	Km\ SC	3	3		Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
191	Vicepresidencia Ejecutiva	32_Córdoba Sucre	Construir Variante Oriental de Sincelejo (calzada sencilla)	Km\ CS	2,6	2,6		Cumple
192	Vicepresidencia Ejecutiva	32_Córdoba Sucre	Construir Intersección a desnivel T del Aeropuerto (Puente)	Puente Vehicular	1	1		Cumple
193	Vicepresidencia Ejecutiva	32_Córdoba Sucre	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	177,13	177,13		Cumple
194	Vicepresidencia Ejecutiva	32_Córdoba Sucre	Realizar Comité de seguimiento	Informe	24	24		Cumple
195	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona	Km\ SC	0,40	0,40		Cumple
196	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Construir el tramo Gambote-Variante Mamonal ( Incluye retornos)	Km\ SC	16,29	16,29		Cumple
197	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Construir Variante Cartagena ( Incluye Retornos) Accesos al puente el Rodeo y Orejas Puente Rodeo	Km\ SC	0,60	0,60		Cumple
199	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Realizar Adquisición Predios Trayecto 1	Predios adquiridos	58	58		Cumple
200	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Construir Puente vehicular Arroyo Canafistola Variante Palmar-Sabangrande	Puente Vehicular	1	1		Cumple
201	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Construir Puentes peatonales La India, Villa Olímpica y PIMSA	Puente Peatonal	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puente la india ubicada en el K0+600, tiene un avance del 99%</li> <li>• Puente Villa Olímpica: presenta un avance de 82,38%.</li> <li>• Puente Peatonal PIMSA K89+150 presenta un avance del 22,47%</li> </ul>	Cumple
202	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Construir Puente vehicular Arroyo Cana Trayecto 8	Puente Vehicular	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
203	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Construir Puente vehicular El Rodeo Variante Cartagena	Puente Vehicular	1	1	Puente finalizado	Cumple
204	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Realizar Adquisición predios Variante Gambote	Predios adquiridos	17	17		Cumple
205	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	257	257		Cumple
206	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Realizar Comité de seguimiento	Acta	24	24		Cumple
207	Vicepresidencia Ejecutiva	34_Ruta del Sol 1	Realizar Estudios y diseños en fase III para el tramo 1	Estudio	1	1	Se han realizado cinco (5) entregas por parte de la empresa Consultora de los Estudios y diseños en fase III (Concol), estos entregables han sido revisados y avalados por la interventoría y la supervisión para tramitar los pagos correspondientes estipulados en el contrato CVH-330 de 2015, a la fecha se ha tramitado el pago del 95% del valor del Contrato. Actualmente se encuentra en trámite de firmas de aprobación de los planos por parte de los especialistas de la interventoría.	Cumple
208	Vicepresidencia Ejecutiva	34_Ruta del Sol 1	Realizar Comité de seguimiento	Acta	36	36	En estos comités de plan de regularización se reúne el equipo de trabajo del proyecto con el fin de evaluar los aspectos sobresalientes del periodo correspondiente.	Cumple
209	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Construir Tramo 2 - SC	Km\ SC	11,19	11,19		Cumple
210	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Construir Tramo 5 - SC	Km\ SC	13,68	13,68		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
211	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Construir Tramo 6 - SC	Km\ SC	29,55	29,55		Cumple
212	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Construir Tramo 7 - SC	Km\ SC	19,00	19,00		Cumple
213	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Realizar Rehabilitación Tramo 6	Km rehabilitados	5,90	5,90		Cumple
214	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Realizar Rehabilitación Tramo 2 La loma Bosconia	Km rehabilitados	2,91	2,91		Cumple
215	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Realizar Rehabilitación Tramo 7	Km rehabilitados	0,41	0,41		Cumple
216	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Realizar Rehabilitación Tramo 8	Km rehabilitados	0,21	0,21		Cumple
217	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Realizar Mantenimiento Rutinario	Km	465	465		Cumple
219	Vicepresidencia de estructuración		Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales	Informes presentados	18	18		Cumple
220	Vicepresidencia de estructuración		Asesorar en materia Económica - Financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones Viales	Informes presentados	16	16		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
221	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la Consultoría integral para la Estructuración del Aeropuerto el Dorado II.	contrato suscrito	1	1		Cumple
222	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la asesoría técnica para Estructuración de Nuevos Proyectos en los modos Carreteros, férreos, Portuarios.	contrato suscrito	1	1		Cumple
223	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la Asesoría económica - Financiera para nuevos proyectos en los modos Carreteros, férreos, Portuarios.	contrato suscrito	1	1		Cumple
225	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la evaluación de las Iniciativas Privadas bajo Esquema APPs Ley 1508 para los modos Carretero, férreos y Aeroportuario.	contrato suscrito	4	4		Cumple
226	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la estructuración Técnica y financiera de 7 proyectos de tercera ola Cuarta Generación de Concesiones: Popayán Pasto, Bogotá Bucaramanga, Bucaramanga pamplona, Duitama - Pamplona - Cúcuta, Norte del Santander, Transversal Cusiana - carare - Boyacá, Manizales - Honda Villeta.	Proyectos Estructura dos	7	7	Se estructuraron los proyectos: - Bucaramanga - Pamplona - Pamplona - Cúcuta - Duitama Pamplona - Barbosa - Bucaramanga - Chinchiná - Mariquita - Sogamoso - Maní - Pasto - Popayán	Cumple
227	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la estructuración, evaluación técnica y financiera de 10 proyectos de segunda ola: Neiva Girardot, Santana Mocoa, Rumichaca Pasto, Popayán - Santander de Quilichao, Villavicencio Yopal, Transversal	Resoluciones.	10	10		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
228	Vicepresidencia de estructuración		de Sisga, Puerta del Hierro Cruz del Viso, BBY, Mar 1 y Mar 2. Contratar la asesoría para analizar, verificar y evaluar como mínimo 6 proyectos de Iniciativa privada del programa 4G: GICA, Malla Vial del Meta, Antioquia Bolívar, Chalajara - Villavicencio, Cambao - Manizales, Cesar Guajira)	Resoluciones.	6	6	Se realizó la evaluación de los proyectos: - Malla vial del meta - Antioquia-Bolívar - Chirajara-Villavicencio - Cambao-Manizales - Cesar-Guajira	Cumple
230	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la evaluación técnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 12 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento: Cayao, Antillana, Buscaja, Soc el Golfo, Sungmin, Oinsas, Gas Licuado del Caribe, CCX, Petrodecól, Retramar, Puerto Antioquia.	Resoluciones.	12	12	Se realizó la evaluación de las solicitudes portuarias: - Puerto Sungmin - Petrodecól - Retramar - Cayao - Puerto Bahía - Puerto Gas Licuado del Caribe - Sociedad portuaria Buscaja	Cumple
231	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la asesoría para contribuir en el desarrollo de la gestión de promoción y Socialización de los proyectos en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones.	Informes presentados	24	24	Se han realizado las socializaciones de los proyectos: - Transversal del Carare - Antioquia-Bolívar - Tercer Carril Bogotá - Girardot - Neiva-Girardot - Cambao-Manizales - Malla vial del Meta - Tren de carga la caro belencito - Cesar-Guajira - Chirajara-Villavicencio - Buga-Buenaventura - Vías del NUS - Duitama-Pamplona - Barboza Bucaramanga	Cumple



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
232	Vicepresidencia de estructuración		Asesorar en el proceso requerido para la instalación de nuevas casetas de peajes o aumento de las tarifas en los peajes existentes en los corredores que hacen parte de los proyectos de cuarta generación de concesiones	Peajes Socializados	32	32	- Chinchiná-mariquita - Estructura REGIOTRAM	Cumple
246	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Defensa Judicial	Realizar reportes trimestrales en relación con los procesos judiciales y trámites prejudiciales a nivel nacional en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructura funja como demandante, demandada o tercero vinculado y/o convocado - Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Reportes trimestrales	4	4		Cumple
248	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2	Elaborar la Resolución por medio de la cual se reglamenta el trámite de Permiso de ocupación temporal en vías Férreas y Carreteras.	Proyecto de Resolución	1	1	Salió mediante Resolución No.716 del 28-04-2015	Cumple
250	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2	Realizar el Informe mensual de las acciones por cada una de las Concesiones Férreas	Informe UNO (1) por Red Férrea del Pacífico y los dos Contratos de Obras y (2) por	24	24		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
255	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2	Emitir conceptos respecto de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios	Conceptos emitidos	100%	100%		Cumple
256	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica estructuración	Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración.	%	100%	100,0%	Solicitudes de la vicepresidencia de Estructuración / Solicitudes atendidas por parte de la GJE	Cumple
257	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica estructuración	Generar elementos que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia Jurídica de Estructuración, así como llevar a cabo el auto socialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Anti trámites y la Ley de información.	%	100%	100,0%	Solicitudes de la Vicepresidencia de Estructuración/Solicitudes atendidas por parte de la GJE	Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
258	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica estructuración	Realizar reuniones de seguimiento y toma de decisiones de asuntos a cargo del grupo Gerencial, así como llevar a cabo reuniones y actividades de mejorar del clima organizacional.	%	100%	100,0%	3 reuniones de seguimiento a la gestión de la gerencia Jurídica de Estructuración y mejoramiento del clima organizacional	Cumple
260	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de Contratación	Establecer mejores prácticas de contratación en los procesos de selección de la Agencia Nacional de Infraestructura. Implementar el reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. Que permitan establecer trazabilidad de las actividades a cargo de la Gerencia de Contratación, así como llevar a cabo el auto socialización del Código de ética y Buen Gobierno, el Estatuto Anticorrupción, la Ley Anti trámites y la Ley de información.	Reporte Unificado de Contratación	3	3		Cumple
262	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de Contratación	Continuar con la medición de indicadores operativos del GIT de Contratación. Continuar con el Mecanismo seguimiento del PAA.	Reporte Unificado de Contratación	3	3		Cumple
264	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Realizar análisis de viabilidad de las modificaciones contractuales y convenios	Concepto de viabilidad	90%	90%		Cumple
266	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Elaborar las modificaciones contractuales viables y/o convenios solicitados a la dependencia	Minuta Otrosí	100%	100,0%		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
267	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Asistir a los planes de seguimiento	Actas de asistencia	90%	90%		Cumple
268	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Generar alternativas jurídicas para la solución de problemáticas y controversias	Concepto Acta	100%	100%		Cumple
270	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Proyectar actas de liquidación	Minuta acta de liquidación	100%	100%		Cumple
271	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Estructurar actas de reversión	Acta de reversión	100%	100%	En la vigencia se realizaron 6 actas de reversión de proyectos	Cumple
272	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Realizar talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales	Acta del Taller	3	3		Cumple
274	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Concepto	80%	80%		Cumple
284	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Realizar Talleres de actualización por parte de la Gerencia Asesoría legal para la revisión de los avances jurisprudenciales, normativos y doctrinales	Acta del Taller	3	3		Cumple
285	Oficina control interno		Entregar el Premio Nacional de Interventorías – Capítulo de Concesiones. Segunda Versión. 2015	Premio	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
286	Oficina control interno		Incorporar los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI	Documento	1	1	Dando cumplimiento al plan de acción de la OCI se realizó el PAA 47.	Cumple
287	Oficina control interno		Realizar 33 visitas de auditoría especial que incluyen seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, para el 2015.	Auditoría	33	33	Dando cumplimiento al plan de auditoría de la OCI se realizaron las auditorías técnicas	Cumple
288	Oficina control interno		Presentar los documentos , de estandarización de niveles de servicio de las interventorías, Consolidado del plan de mejoramiento por procesos - PMP producto de auditorías y la actualización manual de evaluación de desempeño de interventorías	Documentos Ajustados	3	3		Cumple
289	Oficina control interno		Presentar la línea base del Premio Nacional de Concesiones, con énfasis en responsabilidad social y empresarial.	Marco Conceptual	1	1		Cumple
290	Oficina control interno		Realizar 1 informe al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control.	Informe	1	1		Cumple
291	Oficina control interno		Realizar 2 informes al año de la auditoría regular y los que solicite la CGR de las Auditorías especiales.	Informe	2	2		Cumple
292	Oficina control interno		Realizar 65 auditorías independientes.	Informe	64	64	Dando cumplimiento al plan de auditoría de la OCI se realizaron las auditorías a los procesos. A través de comunicado para la	Cumple

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2016**  
**METAS CUMPLIDAS**

ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
							gerencia de planeación del 27 de noviembre del 2015 con número de radicado 20151020137753, se argumentó la eliminación de una auditoría, pasando de 65 a 64 auditorías independientes	
293	Oficina control interno		Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI.	Boletines	33	33		Cumple
294	Oficina control interno		Realizar 2 capacitaciones para fortalecer la cultura de AUTOCONTROL al interior de la ANI.	Capacitaciones	3	3		Cumple
296	Oficina de comunicaciones		Contratar la asesoría para la puesta en marcha de la estrategia general de comunicaciones, incluyendo Redes Sociales y Nuevos Medios Digitales.	Documentos de estrategia de comunicaciones	11	11		Cumple
300	Oficina de comunicaciones		Asistir al congreso anual CCI	Evento	1	1	En el mes de noviembre se asistió al evento y se realizaron varias ponencia	Cumple
301	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar el Anteproyecto de presupuesto 2015	Documento	1	1		Cumple
302	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos Nuevos	Tramite	3	3	Durante el cuarto trimestre no se realizaron tramites	Cumple
303	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar Tramites Presupuestales - Proyectos existentes y del área Administrativa	Tramite	13	13	En el mes de octubre se realizaron 3 trámites correspondientes a traslados del presupuesto de funcionamiento, en noviembre se realizaron 3 trámites, 2	Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
							correspondientes al rubro de Apoyo para la solicitud de vigencias futuras para los contratos de prestación de servicios y 1 correspondiente a la solicitud de vigencias futuras para la construcción del puente Camilo Torres en el proyecto Bosa-Granada-Girardot y la construcción de gaviones en el proyecto Bogotá-Villavicencio. En el mes de diciembre se realizó un trámite para la autorización de un traslado en el presupuesto de funcionamiento para el pago de la nómina	
304	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar Documentos CONPES	Documento	3	3		Cumple
305	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Actualizar la información básica y seguimiento de proyectos (fichas Presidencia, Presentaciones resumen	Documento	472	472	Durante el cuarto trimestre se actualizaron las fichas de los proyectos y se atendieron los derechos de petición y las solicitudes de información realizadas por el Senado	Cumple
306	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar el seguimiento al Plan de Acción Anual (Parcial, mensual y trimestral)	Informe	12	12		Cumple
307	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar el seguimiento a las metas del PND	Informe SISMEG	12	12		Cumple
308	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar la actualización de Proyectos	Proyecto	17	17		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ÍTEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
309	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar el Seguimiento a proyectos en SPI	Proyecto	204	204		Cumple
310	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar Informes de coyuntura y metas (ANI CÓMO VAMOS)	Informe	12	12		Cumple
312	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar eventos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Evento	3	3	De acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Transporte el 17 de diciembre de 2015 se realizó la Audiencia Pública Presencial de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2015.	Cumple
313	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Actualizar y hacer seguimiento a la información de tráfico	Informe	12	12		Cumple
314	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar apoyo al desarrollo de las mesas de trabajo del sector en relación con los insumos y servicios para implementación de los proyectos 4G	Informe	12	12		Cumple
315	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Apoyar el diseño y seguimiento de los planes sectoriales y articularlos con los planes de la Agencia	Documento	4	4	La Agencia participó en la formulación y socialización del Plan Maestro de Transporte, así como, en la formulación y seguimiento del Plan estratégico sectorial	Cumple
316	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar estudio sectorial del impacto fiscal del concesiones 4G	Documento	1	1		Cumple
317	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Elaborar estudio para la regularización de las deudas.	Documento	1	1		Cumple



AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
318	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar el seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Cargue Información	17	17	Durante el último trimestre no se realizó cargue de información	Cumple
321	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Documentar la totalidad de los documentos establecidos en el decreto 4165.	Documentos establecidos	1	1		Cumple
322	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar Auditorías del SIG	Auditoria	3	3		Cumple
323	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Desarrollar la metodología para elaboración de casos de estudio	Metodología	1	1		Cumple
324	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Desarrollar de casos de estudio	Estudio	10	10	Se realizaron los casos de estudio, los cuales ya cuentan con ata de aprobación	Cumple
325	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Desarrollar talleres con los casos de estudio	Taller	5	5		Cumple
326	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Desarrollar contenidos temáticos on-line	Contenidos Virtuales	4	4		Cumple
327	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Desarrollar Metodología y herramientas de Mejoramiento Continuo	Metodología	4	4		Cumple
328	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Desarrollar estructura Balanced ScoreCard	Cuadro de Mando	1	1		Cumple
329	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar la Socialización Balanced ScoreCard	Evento	20	20		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
330	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Adquirir el material didáctico y de apoyo para sensibilización SIG.	Kit	2636	2636		Cumple
331	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Terminar parametrización del Software de Gestión de Calidad	Módulos parametrizados	9	9		Cumple
332	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar la Socialización del Software de Gestión de Calidad	Sesión	30	30		Cumple
333	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Realizar eventos para fortalecer Gestión del Conocimiento	Evento	2	2		Cumple
334	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Hacer el seguimiento de la Planeación Estratégica de la Entidad	Informe	4	4		Cumple
336	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Acompañar a las Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva en el análisis que se soliciten para suscripción de modificaciones contractuales.	Estudios de Conveniencia y Oportunidad Conceptos	152	152		Cumple
337	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Realizar la solicitud a VAF para el desembolso de los recursos a Fidupervisora de los planes de aportes aprobados por MHCP, remitiendo la documentación soporte y dando seguimiento al proceso de giro de la Fidupervisora dentro de los 10 días hábiles establecidos contractualmente**.	Solicitudes	9	9		Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
341	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Adaptación y socialización sobre la metodología para el manejo en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales del Ministerio de Hacienda, de recursos por concepto de posibles sentencias y conciliaciones, teniendo en cuenta las reglamentaciones necesarias para su desarrollo y con base en la identificación de procesos en Litigob.	Socialización	1	1		Cumple
345	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Presentación de los lineamientos que permitan estandarizar los criterios para la valoración de sobrecostos prediales y ambientales en los concesiones en ejecución.	Informe	4	4		Cumple
346	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Presentación de los lineamientos de políticas en riesgos para iniciativas privadas.	Informe	7	7		Cumple
347	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Actividades para fomentar la cultura de administración de los riesgos institucionales y anticorrupción	Actividades	20	20		Cumple
348	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Acompañamiento y capacitación a las áreas y procesos en la inclusión y manejo del esquema de los mapas de riesgo institucional y anticorrupción, en el módulo de riesgos del Aplicativo de Seguimiento y Control del Sistema Integrado de Gestión	Acompañamientos	16	16		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
349	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Implementación del espacio virtual institucional que contenga los lineamientos, mapas de procesos, formatos y herramientas para la efectiva administración del riesgo en la ANI.	Espacio Virtual Implementado	1	1		Cumple
350	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Realizar reuniones de análisis de la gestión predial adelantada en los proyectos de concesión, en las que se identifiquen los casos críticos por resolver, las lecciones aprendidas, las estrategias a implementar y se efectúe el seguimiento a las mismas.	Comité Técnico Predial	17	17		Cumple
351	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Adelantar ante el INCODER el trámite técnico y administrativo que se requiere para la adjudicación de ciento diecinueve (119) predios baldíos existentes en los proyectos de concesión	Adjudicación de predio	119	119		Cumple
352	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Actualizar el Protocolo de Avalúos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2014 y sus decretos y resoluciones reglamentarias	Actualización de Protocolo	1	1		Cumple
353	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión predial	Identificar las Áreas Remanentes adquiridas y los Predios Sobrantes Existentes en los proyectos de concesión, con el fin de verificar el estado actual de las áreas y disponer de los predios que ya no se requieren	Diagnóstico de Áreas Remanentes y Predios Sobrantes	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
			para el desarrollo de obras, según la normatividad existente					
356	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión Socio Ambiental	Apoyar a la VPRE en la Gestión Social de proyectos en concesión	Informe	29	29		Cumple
359	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión Socio Ambiental	Realizar el Seguimiento al cumplimiento del Convenio MININTERIOR - Consultas previas	Informes	21	21	Durante el mes de enero no se realizó reunión y en el mes de marzo solamente se realizó una reunión	Cumple
360	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Soporte - mesa de ayuda	contrato	1	1		Cumple
361	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Licenciamiento de ofimática Microsoft	contrato	1	1	contrato VPRE-463 con la empresa softline internacional de colombia sas	Cumple
362	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Sistema de información predial (CISA)	contrato	1	1		Cumple
363	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Actualización página web	contrato	1	1	CONTRATO VPRE-383 con la empresa XIMIL TECHNOLOGIES S.A.S.	Cumple
364	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Adquirir el Manual ADRM, AIRPORT DEVELOPMENT REFERENCE MANUAL, DECIMA EDICIÓN	contrato	1	1	CONTRATO VPRE-440 con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo – IATA	Cumple
365	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Poner en Alta disponibilidad el firewall de seguridad perimetral y adquisición de un antivirus para los usuarios finales	contrato	1	1		Cumple
366	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Adquisición de un antivirus para los usuarios finales	contrato	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
367	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Revisión del Dominio, adquisición de certificados digitales para el dominio y app para integrar firma digital sobre Orfeo	contrato	1	1		Cumple
368	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Adquisición de computadores de escritorio	contrato	1	1		Cumple
369	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Renovación Licencias Oracle	contrato	1	1		Cumple
370	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Contratar la adquisición de una solución para la administración, seguimiento y control del SGC y su respectiva implementación	contrato	1	1		Cumple
371	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Especificar sistema que automatice la gestión de permisos	contrato	1	1		Cumple
373	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Especificar las necesidades de un nuevo sistema de gestión documental	Documento de especificaciones	1	1		Cumple
374	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Hacer seguimiento al funcionamiento de los sistemas de información en Project y en CISA	Acta de verificación del funcionamiento del sistema de información	5	5		Cumple
375	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Definir los requerimientos de entrega de información para concesionarios e interventorías	Documento de requisitos mínimos	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
376	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Presupuesto	Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación	de entrega de información Anteproyecto	1	1		Cumple
377	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Presupuesto	Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad.	Número de Modificaciones y Propuestas Realizadas	100%	100%		Cumple
378	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Presupuesto	Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos	Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos	100%	100,0%		Cumple
379	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Presupuesto	Realizar el control de la ejecución presupuestal de ingresos	Porcentaje de Recaudación en Efectivo	100%	100,0%		Cumple
380	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Presupuesto	Realizar el control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales	Porcentaje de Ejecución (Pagos)	100%	100%		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
382	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Presupuesto	Actualizar el Manual de Presupuesto	Manual Actualizado	1	1		Cumple
383	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Reporte	12	12	Se registraron las solicitudes de PAC en el SIF Nación II de acuerdo con las solicitudes presentadas por cada ordenador del Gasto.	Cumple
384	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Programar los giros que se realizarán a través de la CUN mensual de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda.	Reporte	12	12	Se efectuaron los pagos programados correspondientes a cada mes según disponibilidad de PAC - CUN.	Cumple
385	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar	Porcentaje de Ejecución (Pagos)	100%	100%		Cumple
386	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Realizar el registro de ingresos en el sistema de información	Registros ingresados	100%	100%		Cumple
387	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Realizar la carga masiva de extractos en el sistema de información SIF Nación II	Carga en el sistema	12	12	Se registraron los movimientos de ingresos y egresos mensuales de acuerdo con los extractos de cada Banco.	Cumple
388	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Elaborar Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIF Nación II y SINFAD	Registros tramitados	100%	100%		Cumple
391	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Actualizar el Manual de Tesorería	Manual Actualizado	1	1	Se actualizó y publicó en el SIG	Cumple



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad/Idex Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
392	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Elaborar el reporte en el aplicativo CHIIP	Informes	4	4		Cumple
393	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Realizar el cierre Contable del Año	Informes	1	1		Cumple
394	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Realizar el cierre mensual y conciliación de cifras	Informes	12	12	Estados Financieros y actas de conciliación : Nómima, Tesorería, servicios generales, modo férreo, jurídica y contractual	Cumple
395	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública	Actas	2	2		Cumple
396	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN	Informes	1	1		Cumple
397	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Elaborar los Estados Contables	Informes	4	4	Balance general, Estado de situación Financiera, Económica y Social, CHIP y operaciones recíprocas	Cumple
398	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Elaborar medios magnéticos DIAN	Informes	1	1		Cumple
399	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Elaborar medios magnéticos SHD	Informes	1	1		Cumple
400	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Actualizar el Manual de Contabilidad	Manual Actualizado	1	1	Se actualizó y publicó en el SIG	Cumple
402	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Archivo y correspondencia	Implementar el formato de conservación de archivos por medios electrónicos PDF/A	Formato	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia:	Concesión:	Actividad:	Unidad de Medida:	Meta/Año:	Avance:	Observaciones:	Estado:
403	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Archivo y correspondencia	Reglamentar el uso del correo electrónico en la Agencia Nacional de Infraestructura	Resolución	1	1		Cumple
405	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Archivo y correspondencia	Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad	Archivo	100%	100%		Cumple
406	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Archivo y correspondencia	Inventariar 1000 CDS	Cd inventario	1000	1000	Meta alcanzada 10000 CDS inventariados	Cumple
408	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Servicios Generales	Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia	%	100%	100%		Cumple
410	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Servicios Generales	Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres.	%	70%	70%		Cumple
411	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Servicios Generales	Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad	%	100%	100%		Cumple
412	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Talento Humano	Diseñar PIC de acuerdo con necesidades de la entidad	PIC diseñado	1	1	El Plan fue diseñado para las vigencias 2015 y 2016 a través del programa UNIANI	Cumple
413	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Talento Humano	Optimizar Procesos de Selección	Proceso	1	1	Proceso que se viene desarrollando en forma permanente de mejora continua	Cumple
414	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Talento Humano	Mantener nivel programas de Bienestar	Programa	1	1	Programación de actividades mensuales, con base en cronograma establecido por el GIT de Talento Humano	Cumple
415	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Control Interno Disciplinario y Atención al Ciudadano	Caracterización de Usuarios	Formato caracterización	1	1		Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
420	Presidencia de la Agencia		Asistir al congreso a citaciones	Citación	12	12	Se asiste a las citaciones a las cuales se solicita asistencia por parte de la Agencia	Cumple

Tabla 4 Plan De Acción 2015 Metas Cumplidas

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
8	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Implementar el Plan de reasentamientos (Varela, Guamachito y Río Frio)	%	1	0		No Cumplido
10	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Construir segunda Línea sector Guamachito	km	4,8	0		No Cumplido
11	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Construir segunda Línea sector Varela y Río Frio	Km	10	0		No Cumplido
20	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del pacífico	Movilización de Carga Comercial	Toneladas	370.000	230.640		No Cumplido
22	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del pacífico	Realizar visitas de Seguimiento al Proyecto	Informe	12	6	Debido a las restricciones presupuestales, no se pudo cumplir con la totalidad de las visitas programadas	No Cumplido
23	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo portuario	Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría	Estudio	13	6		No Cumplido
24	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo portuario	Realizar visitas de supervisión	Informe	104	65	Debido a las restricciones presupuestales no se pudo completar el pan de visitas	No Cumplido

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
29	Vicepresidencia de gestión contractual	grupo interno de trabajo aeroportuario	Pavimentación pista Aeropuerto - Corozal	Actas de Recibo	1	0	A 16 de diciembre se culminaron las obras programadas, estamos a la espera del informe final de interventoría para firmar el acta correspondiente	No Cumple
41	Vicepresidencia de gestión contractual	1_Malla Vial del Meta	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	9	En el mes de septiembre se suscribió el acta de reversión, motivo por el cual no se realizaron más informes de seguimiento	No Cumple
42	Vicepresidencia de gestión contractual	2_Siberia El Vino Villeta	Construir Segunda Calzada	Km\ SC	9,50	6,51		No Cumple
43	Vicepresidencia de gestión contractual	2_Siberia El Vino Villeta	Realizar Rehabilitación	Km Rehabilitado	2	0,76		No Cumple
58	Vicepresidencia de gestión contractual	7_Fontibón Facatativá Los Alpes	Construir Segunda Calzada	Km\ SC	4,2	0	Estas obras se iniciaron en julio de 2015, metas reprogramadas para 2016	No Cumple
63	Vicepresidencia de gestión contractual	9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín - DEVIMED	Construir Segunda Calzada	Km\ SC	9	5,8		No Cumple
67	Vicepresidencia de gestión contractual	10_Armenia Pereira Manizales	Realizar la construcción Intersección Circasia 1 1/2	Un	1	0,95	Se encuentra en operación. Se espera la terminación completa en el mes de enero de 2016	No Cumple
68	Vicepresidencia de gestión contractual	10_Armenia Pereira Manizales	Construir el puente peatonal Bosques de la Acurela	Puente peatonal	1	0	Atendiendo los requerimientos de las licencias ambientales y las solicitudes de las comunidades del proyecto, se evalúa la viabilidad de realizar el diseño y construcción de este puente peatonal. Actividad reprogramada para 2016	No Cumple
75	Vicepresidencia de gestión	11_Pereira La Victoria	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	9		No Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
contractual								
76	Vicepresidencia de gestión contractual	12_Área Metropolitana de Cúcuta	Construir Puente	Puente Vehicular	1	-	Se suscribió el convenio Interadministrativo No. 0995 del 24 de junio de 2015 entre el Instituto Nacional De Vías -INVIAS, Agencia Nacional De Infraestructura – ANI, municipio de San Jose de Cúcuta No. 0995 del 24 de junio de 2015 cuyo objeto es "aunar esfuerzos y coordinar acciones para la ejecución de las actividades que permitan llevar a cabo la solución integral que se requiere en el sector del puente Benito Hernández". actividad reprogramada para 2016	No Cumplido
79	Vicepresidencia de gestión contractual	13_Girardot Ibagué Cajamarca	Construir intersección	Intersección	1	-	Una vez se suscriba un acuerdo entre el INVIAS y el Concesionario San Rafael, el cual está en trámite y fija la responsabilidad del concesionario en efectuar las obras necesarias en los sitios donde hay interrupción de la línea férrea en el momento que ésta entre en operación. actividad reprogramada para 2016	No Cumplido
82	Vicepresidencia de gestión contractual	14_Ruta del Sol 2	Construir Segunda Calzada	Km\ SC	69,64	53,74		No Cumplido
83	Vicepresidencia de gestión contractual	14_Ruta del Sol 2	Realizar rehabilitación	Km - Rehabilitados	74,00	46,33		No Cumplido

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad/da Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
86	Vicepresidencia de gestión contractual	15_Transversal de las Américas	Construir Segunda Calzada	Km\ SC	14,70	4,04	Debido a las diferentes problemáticas del proyecto entre las que se encuentran los periodos de cura y las demandas instauradas no se alcanzó la meta propuesta	No Cumplida
87	Vicepresidencia de gestión contractual	15_Transversal de las Américas	Construir calzada sencilla	Km\ CS	33,31	30,85	Debido a las diferentes problemáticas del proyecto entre las que se encuentran los periodos de cura y las demandas instauradas no se alcanzó la meta propuesta	No Cumplida
97	Vicepresidencia de gestión contractual	18_Conexión Pacífico 1	Realizar Estudios de trazado y diseño Geométrico	Estudio	1	-	El concesionario no entregó los estudios, la Agencia se encuentra analizando el inicio del proceso de incumplimiento	No Cumplida
99	Vicepresidencia de gestión contractual	18_Conexión Pacífico 1	Realizar Estudios de detalle de las unidades funcionales	Estudio	1	-	El concesionario no entregó los estudios, la Agencia se encuentra analizando el inicio del proceso de incumplimiento	No Cumplida
116	Vicepresidencia de gestión contractual	21_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	9		No Cumplida
129	Vicepresidencia de gestión contractual	24_Conexión Norte	Informe de seguimiento	Informe	12	10		No Cumplida
131	Vicepresidencia de gestión contractual	25_Rio Magdalena 2	Realizar Informe de seguimiento	Informe	12	9		No Cumplida
132	Vicepresidencia de gestión contractual	26_Loboguerrero-Buga	Rehabilitación Vía Existente	Km	30,2	26,3		No Cumplida

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
140	Vicepresidencia Ejecutiva	27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Realizar adquisición de los predios necesarios para la terminación de la construcción de la variante El Bolo	Un	2	-	Predios en expropiación judicial. Los procesos de expropiación judicial no permiten garantizar una entrega anticipada de los dos predios.	No Cumple
144	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820	Km\ SC	0,10	-	No se ha liberado el predio del Tanque de Ventaquemada.	No Cumple
151	Vicepresidencia Ejecutiva	28_Briceño Tunja Sogamoso	Realizar Comité de seguimiento	Informe	24	18		No Cumple
155	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente El Vergel	Puente Peatonal	1	0,94	En ambos costados están instaladas y pintadas las barandas, pendiente traslado de redes y adecuaciones laterales finales. Pendiente prueba de carga. El puente esta puesto en servicio sin terminar las obras finales.	No Cumple
157	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente La 22	Puente Peatonal	1	0,99	Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Septiembre de 2015. Pendiente atención a observaciones e iluminación.	No Cumple
158	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente Santa Lucía	Puente Peatonal	1	0,99	Construido y en servicio se le realizó la prueba de carga en Agosto de 2015. Pendiente atención a observaciones e iluminación.	No Cumple
159	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente Yayatá	Puente Peatonal	1	0,88	Está terminada la placa del tablero de la pasarela del puente, instalación y pintura de barandas en las rampas de acceso en ambos costados. Falta la instalación de barandas de la pasarela. No está en servicio, Falta señalización preventiva para evitar ingreso al puente.	No Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
160	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente Cucharal	Puente Peatonal	1	0,99	Construido y en servicio, falta remates y se realizó prueba de carga en Noviembre de 2015 por aprobación de la interventoría. Pendiente restitución de acceso al predio La Primavera costado Girardot - Bogotá.	No Cumple
161	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente Divino Niño	Puente Peatonal	1	0,998	Se encuentra en servicio. Pendiente remates de accesos, ya se realizó prueba de carga.	No Cumple
162	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente Luis Carlos Galán	Puente Peatonal	1	0,998	Construido y en servicio. Se le realizó prueba de carga en octubre de 2015 por aprobación de la interventoría. Pendiente remates de accesos.	No Cumple
163	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente La Esmeralda	Puente Peatonal	1	0,988	En construcción. Se encuentra pendiente la terminación de la instalación de barandas, la prueba de carga, el mejoramiento de los acabados, y la adecuación de los entornos del puente.	No Cumple
164	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Puente José María Córdoba	Puente Peatonal	1	0,989	En construcción, se encuentra pendiente terminar la instalación de las barandas y la prueba de carga.	No Cumple
165	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Pasaganados San José	Pasaganados	1	0,71	Inactivo. Falta construir accesos, drenajes, adecuar redes, reparar carpeta asfáltica, señalización e iluminación. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. Pendiente adquirir un predio.	No Cumple
166	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Pasaganados El Recreo	Pasaganados	1	0,85	Inactivo, se encuentra construido el box Couvert y acceso del costado Girardot – Bogotá. Falta el acceso en el sentido Bogotá –Girardot, adecuación a mixto, señalización e	No Cumple



AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
167	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Pasaganados San Raimundo	Pasaganados	1	0,98	iluminación. Pendiente adquirir un predio. Construido y en servicio. Pendiente atención de observaciones de obra por filtración de agua en toda la estructura, especificaciones técnicas y seguridad vial. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. No se ha terminado la adecuación a mixto, falta señalización e iluminación	No Cumple
168	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Pasaganados Azafranal - Divino Niño	Pasaganados	1	0,70	Inactivo. El paso a desnivel se construyó en tubería metálica. Falta construir accesos, señalización e iluminación.	No Cumple
169	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Pasaganados Quebrada Honda	Pasaganados	1	0,96	Activo. El paso a desnivel se realizó en tubería metálica, en costado Bogotá – Girardot, el muro del acceso presenta falla, los concretos presentan fracturas y grietas. Falta terminar accesos, estabilizar taludes aledaños, adecuación a mixto, señalización e iluminación.	No Cumple
170	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Pasaganados El Tambo	Pasaganados	1	0,48	Inactivo, falta construcción de accesos y cuerpo del box en el sentido Girardot – Bogotá, señalización e iluminación. La comunidad se opone a la construcción.	No Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
171	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Construir Acceso al Municipio de Suárez	Acceso	1	0,985	En servicio; se encuentra pendiente que se construya el canal central para captar las aguas provenientes de las alcantarillas en una longitud de 250m, la nivelación del carril de aceleración con la calzada Bogotá – Girardot, la instalación de la señalización vertical y la empedramiento de los separadores.	No Cumple
172	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Realizar obras de estabilización de Zonas Inestables	Obras	1	0,228	De las 13 zonas a estabilizar que el concesionario reporto en el cronograma se ha trabajado en 4 con un porcentaje de avance 22,77%. Según el cronograma estas estabilizaciones se llevarían a cabo durante 6 meses aproximadamente, lo cual no ha sido cumplido, por esto no se terminara esta meta para el 2015.	No Cumple
173	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Realizar obras de estabilización de Taludes	Obras	1	0,475	El Concesionario no acometido los trabajos de estabilización requeridos en el sector de canecas (Subtrayecto 8D) Para el sector piedra del lancero no ha ejecutado trabajos en la totalidad del talud inestable. Se presenta desprendimiento de material de recubrimiento en concreto. Debido al deslizamiento recientemente presentado se dificulta la terminación de esta obra.	No Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
174	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Realizar rehabilitación de Pavimento	GL	1	0,121	La rehabilitación de 0,27 km de la calzada mixta sur se terminó en el mes de julio de 2015. Lo cual era el único tramo pendiente por rehabilitar. Esta meta de rehabilitación ya está cumplida para las metas de 2015. Mantenimiento periódico. Al avance del mantenimiento periódico se le hace seguimiento basándose en el cronograma presentado por el Concesionario el 6 de marzo del 2015.	No Cumple
175	Vicepresidencia Ejecutiva	29_Bosa Granada Girardot	Realizar obras de Señalización	GL	1	0,86	Se hace un seguimiento dentro de los mantenimientos rutinarios a la señalización horizontal y vertical la cual el Concesionario instala o realiza mantenimiento como instalación de dispositivos de señalización y arreglo de señales que se encuentran en mal estado mensual a lo largo del corredor.	No Cumple
180	Vicepresidencia Ejecutiva	30_Zona Metropolitana de Bucaramanga	Realizar Comité de seguimiento	Informe	24	23		No Cumple
182	Vicepresidencia Ejecutiva	31_Rumichaca Pasto Chachagúf	Identificar los pasivos ambientales correspondientes a los tres (3) expedientes de licenciamiento ambiental de la Concesión RPCHA	UND	3			No Cumple
188	Vicepresidencia Ejecutiva	32_Córdoba Sucre	Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués	Km\ SC	2,3	1,8		No Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
189	Vicepresidencia Ejecutiva	32_Córdoba Sucre	Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo	Km\SC	9	3,1	Persiste el poco avance en la ejecución de las obras por parte del Concesionario. La dificultad en la entrega física del predio del Sr. Payares, que a la fecha no se ha llevado a cabo por parte de los jueces que han llevado el caso de la expropiación del mencionado predio, y la importancia del predio en la extracción del material de corte que debe ser usado en los llenos y terraplenes a construir en la segunda calzada.	No Cumple
224	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la consultoría financiera especializada o banca de inversión que lleve a cabo el caso de negocio de un proyecto minero y de infraestructura	contrato suscrito	1	0	Esta actividad no se realizó	No Cumple
229	Vicepresidencia de estructuración		Contratar la asesoría para analizar, verificar y evaluar como mínimo 3 proyectos Iniciativas privadas para el modo férreo: Proyecto Corredor Férreo Bogotá - Facatativá, Dorada - Chiriguana, Bogotá Belencito.	Resoluciones.	3	0		No Cumple
233	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Jurídico - Predial	Realizar la revisión Jurídica de las Resoluciones que resuelven recursos de reposición	Resolución Revisada	100%	61%		No Cumple
234	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Jurídico - Predial	Realizar la revisión Jurídica de Resoluciones de expropiación judicial y administrativas.	Resolución Revisada	100%	63%		No Cumple
235	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Jurídico - Predial	Realizar la revisión Jurídica de las Promesas de compraventa	Promesas revisadas	100%	58%		No Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
236	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Jurídico - Predial	Realizar la revisión Jurídica de las Escrituras de Compraventa	Escrituras revisadas	100%	51%		No Cumple
237	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Jurídico - Predial	Realizar la revisión Jurídica de las actas de entrega de predios	Actas revisadas	100%	50%		No Cumple
238	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Jurídico - Predial	Atender los requerimientos (Derechos de Petición y solicitud de conceptos) externos e internos, respecto de las situaciones relevantes que se presenten en cada concesión en temas prediales.	Requerimientos Atendidos	100%	73%		No Cumple
239	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Jurídico - Predial	Suscripción de la ejecutoria de los actos administrativos de la gestión jurídico predial	Ejecutoria realizada	100%	38%		No Cumple
240	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Defensa Judicial	Ejercer la representación de los intereses de la Entidad dentro de los trámites administrativos ambientales que se adelanten ante la ANLA en el marco de los proyectos 4G.	Trámites administrativos ambientales	15	0	Debido al recorte presupuestal esta actividad no se llevó a cabo	No Cumple
245	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Defensa Judicial	Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos de expropiación que conforme a las disposiciones contractuales le corresponda adelantar.	Procesos de expropiación	200	190	Los diez predios restantes para la meta quedaron pendientes para la vigencia 2016	No Cumple
252	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2	Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual,	Conceptos Emitidos	100%	97,0%		No Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM.	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
253	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2	Elaborar las Resoluciones por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos	Proyecto de Resolución/Concepto emitido	100%	97,0%		No Cumple
254	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2	Elaborar las Actas de Aprobación de las Pólizas de los Permisos Otorgados	Conceptos emitidos	100%	97,0%		No Cumple
263	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Elaborar conceptos jurídicos de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias	Concepto	80%	79%		No Cumple
269	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Proyectar las resoluciones por las cuales se resuelven las solicitudes en los temas relacionados con permisos carreteros y/o conceptos requiriendo información y/o aclaración y/o complementación de los mismos	Resolución	100%	81%		No Cumple
280	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Realizar acompañamiento a la supervisión de los contratos de concesión portuaria en las visitas a las instalaciones de los concesionarios	Copia formato de legalización de comisión	5	3	Debido a las restricciones presupuestales no se pudieron realizar la totalidad de las actividades programadas	No Cumple
281	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Elaborar actas de reversión con ocasión de la terminación de los contratos de concesión portuaria, contando con los insumos requeridos para el	Acta de reversión	80%	0%	En la vigencia no se ha requerido proyectar actas de reversión	No Cumple

AGENCIA NACIONAL INFRAESTRUCTURA - PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
			efecto					
297	Oficina de comunicaciones		Contratar una empresa que elabore piezas de diseño, piezas audiovisuales y de difusión editorial	Piezas comunicativas	11	0	Debido a las restricciones presupuestales esta actividad no fue realizada	No Cumple
319	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Automatizar de procedimientos de recursos humanos.	Procedimientos automatizados	1	0		No Cumple
338	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contingentes pendientes de pago en las vigencias 2013 y 2014 con la Fiduprevisora.	Oficios remitidos al MHCP	14	7		No Cumple
355	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión Socio Ambiental	Apoyar a la VPRE en los temas de Gestión Ambiental de los proyectos en concesión	Informe	36	24	Durante el primer trimestre no se requirió la presentación de informes	No Cumple
357	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión Socio Ambiental	Realizar capacitación a la Gerencia Socio - Ambiental en el tema de Liderazgo y Resolución de Conflictos	Jornada	1	0	Actividad reprogramada para la vigencia 2016	No Cumple
358	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión Socio Ambiental	Generar Políticas en la Gestión Social para la construcción de variantes en proyectos de concesión y APP	Documento	1	0	Actividad reprogramada para la vigencia 2016	No Cumple
381	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Presupuesto	Elaborar Informe de revisión de los cumplidos para el pago a terceros	No. de cumplidos recibidos y entregados al	100%			No Cumple

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS NO CUMPLIDAS								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
área de contabilidad								
389	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Elaborar Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II	Registros ingresados	100%	75%		No Cumple
390	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Tesorería	Elaborar Boletines de Tesorería	Boletín Diario	100%	75%		No Cumple
404	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Archivo y correspondencia	Analizar, diseñar y desarrollar una técnica que permita hacer búsquedas estilo google de los documentos radicados.	Metodología	1	0	Actividad reprogramada para la vigencia 2016	No Cumple
407	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Archivo y correspondencia	Implementar la norma ISAD G para descripción de archivos por medio de Orfeo.	Resolución	1	0		No Cumple
409	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Servicios Generales	Realizar el cambio de placas de inventarios de bienes	%	100%	90%		No Cumple
418	Presidencia de la Agencia		Realizar reuniones con inversionistas nacionales e internacionales	Reuniones	48	36		No Cumple

Tabla 5 Plan De Acción 2015 Metas No Cumplidas

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS SOBRESALIENTES								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
12	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Proyección Toneladas a Transportar	M Ton	43,2	47,7		Sobresaliente
13	Vicepresidencia de gestión contractual	Concesión férrea del atlántico	Contratar la recuperación en Dorada - Chiriguana - Puntos Críticos Total: 47 Puntos -	Und	26	41		Sobresaliente



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS SOBRESALIENTES								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
			Pendientes 2015					
49	Vicepresidencia de gestión contractual	4_Bogotá Villavicencio	Construir Túneles sectores 2A y 3A	Tunel	4	5		Sobresaliente
84	Vicepresidencia de gestión contractual	14_Ruta del Sol 2	Construir Puentes Vehiculares	Puente Vehicular	9	12	Se anticipó la construcción y puesta en servicio de 2 puentes	Sobresaliente
89	Vicepresidencia de gestión contractual	15_Transversal de las Américas	Realizar rehabilitación	Km - Rehabilitados	37,87	42,90		Sobresaliente
90	Vicepresidencia de gestión contractual	15_Transversal de las Américas	Realizar mejoramiento	Km - Mejorados	93,29	96,31		Sobresaliente
94	Vicepresidencia de gestión contractual	17_Zipacquirá-Palenque-N	Realizar Rehabilitación Vía Existente	Km - Rehabilitados	120	252,4		Sobresaliente
136	Vicepresidencia Ejecutiva	27_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca	Construir calzada sencilla MVVVC (T2: Variante Bolo 200 m,T5:Variante Yotoco 245 m + T7: La Guaira 3755 m)	Km\ SC	4,20	4,33	Corresponde a la construcción de 3,606 Km de segunda calzada en el sector La Guaira y 0,73 Km en la intersección de Santa Elena	Sobresaliente
198	Vicepresidencia Ejecutiva	33_Ruta Caribe	Construir Variante Sabanagrande- Palmar de Varela	Km\ SC	8	9,90		Sobresaliente
218	Vicepresidencia Ejecutiva	35_Ruta del Sol 3	Realizar Comité de seguimiento	Acta	24	31		Sobresaliente
241	Vicepresidencia Jurídica	Gerencia Defensa Judicial	Adelantar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012, con observancia del debido proceso y los preceptos legales aplicables, a que haya lugar en relación con las concesiones respecto de las cuales el supervisor y la interventoría informe y soporte los retrasos en la ejecución o cualquier otro tipo de incumplimiento y solicite el	Trámites sancionatorios contractuales	12	26	Durante la presente vigencia se han adelantado 23 trámites sancionatorios.	Sobresaliente

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS SOBRESALIENTES								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
242	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Defensa Judicial	adelantamiento del respectivo proceso impositivo de multas- al GIT de Defensa Judicial Defender de manera oportuna los intereses de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada	Tribunales de arbitramento	20	34		Sobresaliente
243	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Defensa Judicial	Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada	Procesos judiciales y extrajudiciales	800	880	La Agencia ha realizado ha ejercido la representación en cada uno de los procesos activos	Sobresaliente
244	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Defensa Judicial	Reunir mínimo dos (2) vez al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial.	Sesiones de comité	24	56	Debido a la cantidad de procesos a cargo de la gerencia se hizo necesario realizar más sesiones de comité de las inicialmente programadas	Sobresaliente
247	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Defensa Judicial	Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público.	Acciones penales y policivas	20	32	La Agencia 32 procesos ha ejercido la representación de la Entidad y el seguimiento a los procesos penales en los que la ANI interviene como denunciante o víctima	Sobresaliente
249	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2	Realizar Informe mensual por cada Concesión vial de los temas tratados en los comités de regularización primarios y que se encuentren a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2.	Informe UNO (1) por cada proyecto vial.	168	181		Sobresaliente
251	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 2	Realizar el Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuarias	Informe UNO (1) por cada proyecto.	84	93		Sobresaliente

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS SOBRESALIENTES								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
259	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de Contratación	Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia.	N° de Proyectos APP adjudicados	10	18	Se superó la meta debido a que se presentaron y adjudicaron IPS	Sobresaliente
261	Vicepresidencia jurídica	Gerencia de Contratación	Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida	Actas de Comité	24	126	Debido a las necesidades de contratación se convocaron más comités mensuales	Sobresaliente
265	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato	Presentación al comité + Acta de asistencia	80%	83,3%		Sobresaliente
273	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Elaboración del proyecto de Pliego de Cargos	Minuta del pliego de Cargos	90%	93%		Sobresaliente
275	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Resolución	80%	100%	Durante la vigencia solo se emitieron tres resoluciones en el mes de diciembre	Sobresaliente

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS SOBRESALIENTES								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta/Año	Avance	Observaciones	Estado
276	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Presentación al comité + Acta de asistencia	80%	100%	7 reuniones del comité a las cuales fueron convocados	Sobresaliente
277	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Elaborar minuta de Otrosí modificatorio de las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Otrosí	80%	85%	Durante la vigencia se elaboraron 24 minutas con modificaciones	Sobresaliente
278	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Elaborar y remitir a la Gerencia de Defensa Judicial del Pliego de Cargos para iniciar actuación administrativa sancionatoria, contando para el efecto con: el informe de supervisión respectivo, la cuantificación de la multa o sanción aplicable por parte del área financiera, y los demás documentos exigidos para el efecto por dicha dependencia.	Pliego de cargos	90%	100%	Se remitieron en la vigencia 3 pliegos de cargos	Sobresaliente
279	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Asistir a reuniones con otras dependencias de la entidad y con los Concesionarios	Informe ejecutivo de reunión	70	294	Debido al gran número de temas a tratar en cada proyecto se hizo necesario programar y realizar mayor número de reuniones	Sobresaliente
282	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Elaborar actos administrativos que resuelvan asuntos distintos a las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria	Resolución	80%	100%		Sobresaliente

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS SOBRESALIENTES								
ITEM	Vicepresidencia	% Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
283	Vicepresidencia jurídica	Gerencia Gestión jurídica Contractual 1	Participar en iniciativas de modificación y/o reglamentación de la normatividad aplicable a la actividad portuaria	Informe ejecutivo	2	7		Sobresaliente
295	Oficina de comunicaciones		Asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en la implementación de la estrategia de comunicaciones para los temas portuarios, ferroviarios y aeroportuarios y de nuevos proyectos de APP	Piezas comunicativas	660	800		Sobresaliente
298	Oficina de comunicaciones		Realizar el Monitoreo de Medios	Correos electrónicos	220	330	Durante el último trimestre de 2015 se incrementó sustancialmente la presencia de la Agencia en la redes sociales	Sobresaliente
299	Oficina de comunicaciones		Asistir a eventos de inauguración, actas de inicio y primeras piedras	Evento	88	98		Sobresaliente
311	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Planeación	Realizar el seguimiento y apoyo para la generación de la información estadística DANE	Reunión	4	7	En desarrollo de las reuniones se definió y actualizó el diccionario de datos y la documentación de la operación estadística de tráfico y recaudo	Sobresaliente
320	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Calidad y gestión del conocimiento	Documentar acuerdos de niveles de servicio.	Acuerdos documentados	1	6	Se realizaron las observaciones de los acuerdos dentro de los procedimientos identificados	Sobresaliente
335	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Priorizar la distribución de los recursos asignados en el rubro de servicio de la deuda, teniendo en cuenta la restricción presupuestal actual, con base en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión	Informe	2	18		Sobresaliente

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015								
METAS SOBRESALIENTES								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
339	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. Seguimiento a los procesos de solicitud de plan de aportes tramitados durante la vigencia 2014, para lograr su aprobación.	Seguimientos	18	36		Sobresaliente
340	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Seguimiento a Reprogramación planes de aportes programa 4G	Seguimientos	1	19		Sobresaliente
342	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Actualización de los seguimientos de riesgos de los contratos en ejecución con y sin plan de aportes en el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales, de acuerdo a las necesidades reportadas.	Seguimientos presentados	14	24		Sobresaliente
343	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Acompañamiento en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros.	(Matriz de Riesgos para la estructuración y contratación de consultorías, interventorías y modificaciones de las mismas.) Interventoría	5	48		Sobresaliente
344	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión de Riesgos	Revisión y unificación de las metodologías de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura desarrollados a través de esquema de Asociaciones Público Privadas - APP.	Informe	1	3		Sobresaliente

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN 2015 METAS SOBRESALIENTES								
ITEM	Vicepresidencia	Concesión	Actividad	Unidad de Medida	Meta Año	Avance	Observaciones	Estado
354	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Gestión Socio Ambiental	Realizar reuniones del Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Mininterior, INCODER, etc.	Cuadro de Seguimiento	12	14		Sobresaliente
372	Vicepresidencia de planeación, riesgos y entorno	Sistemas de Información y Tecnología	Socializaciones de la plataforma TI	Socializaciones realizadas	4	16		Sobresaliente
401	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Contabilidad	Publicar información contable en la web	Informes	4	8	Publicación mensual	Sobresaliente
416	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Control Interno Disciplinario y Atención al Ciudadano	Encuestas Percepción Ciudadana	Encuesta	2	4	Inicialmente se tenía programado hacer dos encuestas a los ciudadanos, sin embargo y debido a la implementación de nuevas herramientas para la recolección de información (Buzón Contáctenos, ORFEO, encuesta en Página WEB) al finalizar la vigencia se realizaron más de la meta programada	Sobresaliente
417	Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Control Interno Disciplinario y Atención al Ciudadano	Afianzamiento cultura servicio ciudadano	Entrenamiento	6	30	Inicialmente se habían programado 6 charlas en grupos grandes, sin embargo, la dinámica hizo que las capacitaciones se realizaran en grupos pequeños, de igual manera la capacitación dinamizó que otros grupos solicitaran ser incluidos en el programa finalizando en 30 capacitaciones en el año	Sobresaliente
419	Presidencia de la Agencia		Realizar atención de peticiones del congreso	Cuestionario	24	29		Sobresaliente

Tabla 6 Plan De Acción 2015 Metas sobresalientes
