




SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO	GCSP-F-223
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE	VERSIÓN	001
FORMATO	INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS	FECHA	9/12/2016

INFORME EJECUTIVO AEROPUERTOS

CÓDIGO	AC-01	PROYECTO	Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Sarmiento Angulo Contrato No. 6000169OK de 2006	FECHA ACTUALIZACIÓN	24/05/2021
---------------	-------	-----------------	--	----------------------------	------------




1. INFORMACIÓN GENERAL

CONCESIONARIO	INTERVENTORÍA OPERATIVA	ANI
<p>OPAIN S.A. - Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional</p> <p>Gerente Andres Ortega Rezk</p> <p>N.º contrato 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006</p> <p>Composición Accionara</p> 	<p>CONSORCIO OPERADOR AEROPORTUARIO</p> <p>Directora Silvia Fernández de Castro</p> <p>N.º contrato 9000070 OK del 4 de junio de 2009</p> <p>Composición Accionara</p> 	<p>VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>GERENTE Maria Eugenia Arcila Zuluaga</p> <p>Apoyo a la Supervisión</p> <ul style="list-style-type: none"> Edgardo Garciaherreros Barrera (Coordinador) Mario Nicolás Cortés Gutierrez (Técnico) Jorge Jaramillo Torres (Operativo) Norma Liliana Gutierrez Gamboa (Ambiental) Luis Enrique Moreno Barbosa (Financiero) Maria Fernanda Esteban (Jurídico) Heriberto Amado (Riesgos) Martha Milena Cordoba Pumalpa (Social)

Aeropuertos	Internacional Eldorado "Luis Carlos Galán Sarmiento" BOGOTÁ D.C.
--------------------	--

Objeto del Contrato: Contrato de Concesión para la Administración, Modernización y Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento del Área Concesionada del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.

FECHAS IMPORTANTES

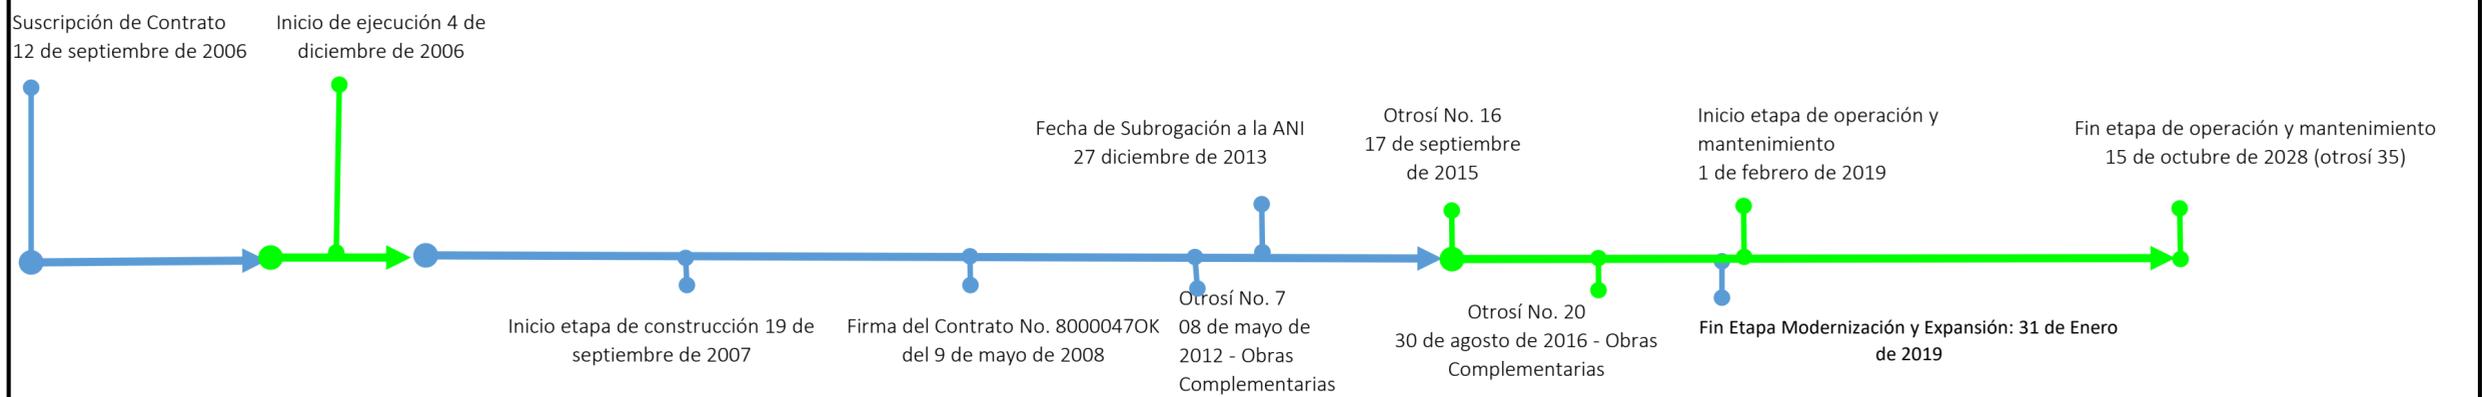

2. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO



66%

ESTADO ACTUAL

Etapa Final (Operación y Mantenimiento)


% del plazo total del contrato de concesión (incluye plazo compensación por la Covid-19 del otrosí 35)

SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN

OBJETO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	INVERSIÓN (M\$)

INAUGURACIONES DE LA VIGENCIA

2020



VERIFICADO

Maria Eugenia Arcila Zuluaga
 MARIA EUGENIA ARCILA ZULUAGA - GERENTE DE PROYECTOS AEROPORTUARIOS
Mario Nicolás Cortés

Edgardo García Herreiros Barrera
 EDGARDO GARCIAHERREIROS BARRERA - Experto 8 Grado 3
